



TERMS OF REFERENCE

EXTERNAL SERVICES TO SUPPORT THE HUMANITARIAN STRATEGY:

PROTECTION OF THE RIGHTS AND DIGNITY OF THE PALESTINIAN POPULATION UNDER OCCUPATION, IN ACCORDANCE WITH IHL AND IHRL, WITH SPECIAL EMPHASIS ON THE FIGHT AGAINST GENDER-BASED VIOLENCE AND INEQUALITY, CHILD PROTECTION AND DIASTER RISK REDUCTION (DRR)

MODIFICATION Nº 1, 11/12/2020

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ

Program funded by:





Table of contents

0.	List of acronyms.....	0
1.	Introduction.....	1
1.1	<i>Overview of Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP)</i>	<i>1</i>
1.2	<i>Background to ACPP’s humanitarian interventions in Palestine</i>	<i>1</i>
1.3	<i>ACPP’s current Humanitarian Strategy in Palestine: The Action Group for Organised Local Response..</i>	<i>2</i>
2.	Purpose and scope of the work.....	3
3.	Participating entities.....	4
4.	Limitations	6
5.	Criteria and questions to be addressed by the evaluation	6
6.	Products to be delivered and reporting requirements	7
	<i>Block 1: Overall programmatic evaluation report on ACPP’s Humanitarian Strategy in Palestine, and seven separate evaluation reports for specific projects that form part of this Strategy.....</i>	<i>7</i>
	<i>Block 2: Overall monitoring, evaluation, accountability, and learning (MEAL) plan for ACPP’s Humanitarian Strategy in Palestine.....</i>	<i>10</i>
	<i>Block 3: Needs assessment for the next phase of ACPP’s Humanitarian Strategy in Palestine, for the period 2022-2023.....</i>	<i>11</i>
7.	Methodology	13
	<i>Block 1: Overall programmatic evaluation report on ACPP’s Humanitarian Strategy in Palestine, and seven separate evaluation reports for specific projects that form part of this Strategy.....</i>	<i>13</i>
	<i>Block 2: Overall monitoring, evaluation, accountability, and learning (MEAL) plan for ACPP’s Humanitarian Strategy in Palestine.....</i>	<i>14</i>
	<i>Block 3: Needs assessment for the next phase of ACPP’s Humanitarian Strategy in Palestine, for the period 2022-2023.....</i>	<i>14</i>
8.	Workplan	15
9.	Budget	17
10.	Content of offers	17
11.	Requirements and selection criteria of the Consulting Team (natural or legal person)	18
12.	Submission of offers	19
13.	Queries	19
14.	Evaluation of offers	19
15.	Premises of the evaluation, authorship and publication	20
	Annex 1a: Map of Action Group target communities in the Governorate of Hebron	21
	Annex 1b: Map of Action Group target communities in the Governorate of Salfit	22
	Annex 1c: Map of Action Group target communities in the Governorate of Qalqiliya.....	23
	Annex 2a: ACCD 2017 project sheet.....	24
	Annex 2b: GVA 2018 project sheet	26
	Annex 2c: AACID 2017 project sheet.....	31
	Annex 2d: AEXCID 2018 project sheet.....	37
	Annex 2e: AACID 2016 project sheet	44
	Annex 2f: AACID 2018 project sheet	49
	Annex 2g: GVA 2019 project sheet.....	55
	Annex 3: ACPP’s Code of Conduct.....	60
	Annex 4: ACPP’s Goods and Services Procurement Manual	61



0. List of acronyms

AACID	Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
ACCD	Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
AEXCID	Agencia Extremeña De Cooperación Internacional Para el Desarrollo
ACPP	Asamblea de Cooperación por la Paz
GVA	Generalitat Valenciana
PARC	Agricultural Development Association
PHG	Palestinian Hydrology Group
PRCS	Palestinian Red Crescent Society
PSCCW	Psycho-Social Counselling Center for Women
WASH	Water, Sanitation and Hygiene



1. Introduction

1.1 Overview of Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP)

Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) is a Spanish NGO founded in 1990, and which currently works in 18 countries around the world in the fields of development cooperation and humanitarian action; as well as in 16 of Spain's Autonomous Communities in the areas of education for development and social intervention. ACPP seeks to be an instrument of change for those who aspire to live in a world built on the pillars of dignity, justice and equality. It has been working in Palestine since 1993 together with local civil society partners, ultimately to strengthen the ability of the Palestinian population to enjoy their basic human rights, and to contribute to seeking a just and peaceful end to the Israeli occupation of Palestine; in a way that promotes the cross-cutting priorities of human rights, strengthening local civil society, conflict resolution, gender equality and environmental sustainability.

1.2 Background to ACPP's humanitarian interventions in Palestine

Given the prolonged humanitarian crisis in which Palestine has been immersed for the past two decades, humanitarian response has constituted a major component of ACPP's work in the territory since 2000. In operational terms, the organisation's humanitarian response strategy has evolved over the years, geographically, sectorally and conceptually.

At the outbreak of the Second Intifada in 2000, ACPP's main Palestinian partners were the Palestinian Red Crescent Society (PRCS) and the Palestinian Hydrology Group (PHG), with whom it worked in both the West Bank (including East Jerusalem) and the Gaza Strip, in the health, and WASH and food security sectors respectively. From 2003, another Palestinian partner organisation, the Agricultural Development Association (PARC), was incorporated into ACPP's Humanitarian Strategy, with a focus on supporting agricultural livelihoods and food security in rural communities in Area C, in those affected by the construction of the Separation Wall, and in the Gaza Strip.

This sectoral and geographical focus remained in place until the PRCS and interventions in the health sector were phased out from 2010 onwards, and a greater focus was placed on WASH, food security, livelihoods and community protection interventions in Area C communities in the West Bank, with a gradual reduction in ACPP's presence in the Gaza Strip.

In 2014, in recognition of the need to incorporate a greater protection and advocacy focus in the organisation's Humanitarian Strategy, ACPP integrated its Israeli partner organisations – Peace Now, BIMKOM and All for Peace Radio - into its humanitarian interventions, directed at Israeli and international duty bearers and focusing, respectively, on Israeli settlements as a key source of human rights violations against the Palestinian population; the restrictive planning regime imposed by Israel on Area C communities to preclude their development; and recording the testimonies of the Palestinian Area C population to be used in advocacy initiatives to visibilise and prevent human rights violations.

Finally, from 2016 onwards, additional partners have been incorporated into ACPP's Humanitarian Strategy, including (a) the Palestinian Psycho-Social Counselling Center for Women (PSCCW), with the purpose of strengthening the gender, child protection and education in emergencies foci of the organisation's humanitarian interventions; (b) Yesh Din – Volunteers for Human Rights, focusing on information, counselling and legal assistance (ICLA), the documentation of, and advocacy around human rights violations committed by Israeli actors against the Palestinian population; and the access of Palestinians affected by human rights violations to justice under the Israeli judicial system; (c) B'Tselem - The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories, centring on the documentation of, and advocacy and legal action around



human rights violations against the Palestinian population; and Ir Amim, focusing on the right to the city and the right to education in the context of Jerusalem.

1.3 ACPP's current Humanitarian Strategy in Palestine: The Action Group for Organised Local Response

From 2017 onwards, ACPP began to consolidate and structure its multi-sectoral, multi-actor humanitarian work into a unified Humanitarian Strategy, leading directly to the creation of the Action Group for Organised Local Response (Action Group) in 2018. The Action Group is currently composed of four permanent Palestinian and Spanish member organisations - PARC, PHG, PSCCW and ACPP - but is open to membership by other organisations. It also engages with other Palestinian actors on a technical basis, including the Palestinian Civil Defence, the Palestinian Medical Relief Society, and Defence for Children International-Palestine.

In addition, ACPP contracts the services of Israeli human rights actors to implement components of its Humanitarian Strategy with the Action Group.

The work of the Action Group seeks to respond to the lack of access to, and protection of the rights and dignity of the Palestinian population under occupation in accordance with IHL and IHLR, with special emphasis on the fight against gender-based violence and inequality, child protection and Disaster Risk Reduction (DRR). The design of its strategy is based on annual, participatory needs assessments that have been conducted by the Action Group since 2017.

Geographically, the Action Group's strategy is concentrated on communities located partially in Area C of the West Bank, primarily in the governorates of Salfit and Qalqiliya, in order to maximise impact and optimise resources. Sectorally, it centres on agricultural livelihoods, food security and community-based protection (PARC); WASH (PHG); gender, child protection, psychosocial health, Information, Counselling and Legal Assistance (ICLA), education and cash and voucher assistance (CVA) (PSCCW); and protection around access to justice and ICLA, urban planning and land and property rights, Israeli settlements as a human rights violation, and the monitoring and exposure of human rights violations in general.

In terms of cross-cutting approaches, this unique partnership promotes the **localisation** of humanitarian response in Palestine, and seeks to strengthen local civil society in two key ways: (1) by promoting alliances between Palestinian civil society organizations and public institutions; and between Palestinian civil society organizations and other actors around the shared platform of human rights; and (2) by promoting the creation of community-based protection mechanisms (Community Protection Committees) to strengthen the social fabric in target communities around the question of the defence of the rights of the Palestinian people under occupation; to promote their participation in shaping decisions that affect them; and building their capacities to identify and respond to natural and/or human risks and threats, thereby promoting community ownership of the humanitarian response.

It also integrates the **Triple Nexus** approach into its response, seeking not only to meet the humanitarian needs of Palestinian communities affected by the prolonged protection crisis, but to reduce their risk, vulnerability and overall levels of need, and strengthen their resilience in a way that bridges with development actions and actors. It does so over mid to long-term timespan, and by combining the effort of different actors, based on their comparative advantages. The strategy also incorporates the peace axis of the Triple Nexus, by enhancing local capacities for conflict resolution and peace at different levels and across existing divides, and with a special focus on promoting the role of women in peace-making.



Finally, in financial terms, the Action Group's strategy to date has been funded by several Spanish decentralised public institutions, through ACPP. These institutions include:

Name (Spanish)	Name (English)	Acronym (Spanish)
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo	Andalusian Agency for International Cooperation and Development	AACID
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament	Catalonian Agency for Development Cooperation	ACCD
Agencia Extremeña De Cooperación Internacional Para El Desarrollo	Extremeñan Agency for International Cooperation and Development	AEXCID
Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo	Basque Agency for Development Cooperation	AVCD
Ayuntamiento de Córdoba	Local Government of Cordoba City	-
Ayuntamiento de Donostia	Local Government of Donostia City	
Ayuntamiento de Málaga	Local Government of Malaga City	-
Ayuntamiento de Sevilla	Local Government of Seville City	-
Ayuntamiento de Valencia	Local Government of Valencia City	-
Diputación de Cádiz	Provincial Government of Cadiz	
Diputación de Córdoba	Provincial Government of Cordoba	-
Fons Mallorquí de Solidaritat y Cooperació	Mallorcan Fund for Solidarity and Cooperation	-
Generalitat Valenciana	Regional Government of Valencia	GVA
Gobierno de Cantabria	Regional Government of Cantabria	-
Gobierno de las Islas Baleares	Regional Government of the Balearic Islands	GOIB
Xunta de Galicia	Regional Government of Galicia	-

2. Purpose and scope of the work

As mentioned above, ACPP has been leading the implementation of a unified, multi-actor, multi-sector Humanitarian Strategy in Palestine since 2017, of which the Action Group has been a key strategic and operational mechanism. A number of larger projects through which this strategy has been operationalized over the past few years have recently finalized their implementation, or will do so in the near future. As such, ACPP sees this as a key moment in which to assess the progress and achievements of its Humanitarian Strategy and the work of the Action Group to date, in terms of:

- a. Responding effectively to the humanitarian needs, and contributing to the protection of the rights and dignity of the Palestinian population under occupation, in accordance with IHL and IHRL, with special emphasis on the fight against gender-based violence and inequality, child protection and Disaster Risk Reduction (DRR).
- b. The effectiveness of the Action Group as a multi-actor, multi-sectoral mechanism with a fundamental focus on localization, the Nexus framework and bringing together diverse actors around a common agenda, in achieving this objective.

The evaluations conducted under Block 1 of the products to be delivered under the present ToRs (see below) should serve as a learning tool for the Action Group to assess the relevance, functioning, results and impact of its interventions, and therefore guide future actions, as well as strengthening the Action Group itself. It



should also serve as means by which the Action Group is held accountable vis a vis key actors engaged in its interventions, both in Palestine and in Spain.

In terms of geographical scope, the evaluations to be conducted under Block 1 will assess all projects implemented by the Action Group in the following communities of the Governorates of Salfit and Qalqiliya, from 2017 to date:

Hebron	Salfit	Qalqiliya
Deir al Asal (Faqua and Tahta)	Bruqin	Immatin
Halhoul	Deir Ballout	Jinsafut
	Deir Istiya	Jit
	Haris	
	Iskaka	
	Kafr ad Dik	
	Kifl Haris	
	Marda	
	Masha	
	Qarawat Bani Hassan	
	Rafat	
	Sarta	
	Yasuf	

See Annex 1 for maps of the target communities.

Given that the evaluations to be conducted under Block 1 will cover the entire strategy of the Action Group, including interventions that have already been finalized as well as interventions that will end their implementation in the coming months (see section 9 for more information), the period covered by the evaluation will be from 1 January 2019 to 16 September 2021.

The purpose and scope of work to be carried out under Blocks 2 and 3 of the products to be delivered under the present ToRs (see below), is to strengthen the MEAL framework of ACPP's Humanitarian Strategy and the work undertaken by the Action Group (Block 2); and to guide what ACPP and the Action Group should be doing, where, how and with whom in the period from 2022-2023, in terms of addressing the humanitarian priorities of the Palestinian population under Occupation in the West Bank (Block 3).

3. Participating entities

The entities involved in the Action Group, and that should be engaged in all work to be conducted under the present ToRs are as follows:

Organisation	Role
Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), Spain	Core member of the Action Group, and member of its Technical and Steering Committees; responsible for the overall design, formulation, implementation, management of, and reporting on interventions carried out by the Action Group.
Agricultural Development Association (PARC), Palestine	Core member of the Action Group, and member of its Technical and Steering Committees; responsible for supporting the design and formulation of interventions relating to community protection,



Organisation	Role
	livelihoods and food security; and for the implementation and management of, and reporting on the same.
Palestinian Hydrology Group (PHG), Palestine	Core member of the Action Group, and member of its Technical and Steering Committees; responsible for supporting the design and formulation of WASH interventions; and for the implementation and management of, and reporting on the same.
Psych-Social Counselling Centre for Women (PSCCW), Palestine	Core member of the Action Group, and member of its Technical and Steering Committees; responsible for supporting the design and formulation of interventions relating to gender, mental health, child protection, community protection, ICLA and cash-based assistance; and for the implementation and management of, and reporting on the same.


Other key entities that should be involved include Israeli human rights actors whose services are contracted by ACPP to implement components of its Humanitarian Strategy with the Action Group.

Rights holders and duty bearers in the target communities that have participated in the implementation of the Humanitarian Strategy, and that should be engaged in the work to be conducted under the present ToRs, are as follows:

Governorate	Community	Actor
Salfit	Bruqin	<ul style="list-style-type: none"> – Representatives of local authorities – Members of Community Protection Committees – Persons implicated in the participatory processes for the development of Community Protection and DRR Plans (women, farmers, children, youth, people with disabilities) – Members of women’s community-based organisations targeted under the Program – The educational community (students, parents, teachers) of schools targeted under the Program – Women and girls, and men and boys targeted by specific activities under the Program
	Deir Ballout	
	Deir Istiya	
	Haris	
	Immatin	
	Iskaka	
	Kafr ad Dik	
	Kifl Haris	
	Marda	
	Masha	
	Qarawat Bani Hassan	
	Rafat	
	Sarta	
Yasuf		
Qalqiliya	Jit	
	Jinsafut	
Hebron	Halhoul	
	Deir Al Asal	

Finally, responsibility holders and duty bearers, representatives of the following Spanish institutions should also be involved in the evaluation:

- Catalanian Agency for Development Cooperation

- 
- Regional Government of Valencia
 - Andalusian Agency for International Cooperation and Development
 - Extremenian Agency for International Cooperation and Development

4. Limitations

Main limitations are related to the COVID-19 crisis. The constant uncertainty and recurrent impediments to the different communities may put at risk the possibility of conducting field visits and face-to-face interviews with the target population and other key actors.

For this reason, the methodological design of the products to be delivered under these ToRs should take into account: (a) the ability of the Consulting Team to physically access the target communities; and (b) a field work methodology that includes online tools.

5. Criteria and questions to be addressed by the evaluation

The objective of the evaluation is to obtain a constructively critical, external understanding of the process of the implementation of ACPP and the Action Group's Humanitarian Strategy and the results and objectives achieved as a result of this process.

The evaluation must provide an external and objective view of the processes, so that conclusions, recommendations and lessons can be drawn to improve future interventions within the framework of the ACPP's Humanitarian Strategy and the interventions of the Action Group.

The evaluation should assess the Humanitarian Strategy based on international standards in the field of international humanitarian law, human rights, and the humanitarian principles defined in the Humanitarian Charter and the Sphere Manual. It will also assess the results and effects of the Humanitarian Strategy and the work of the Action Group based on the OECD DAC evaluation criteria.

Specifically, the evaluation address the following criteria:

- Relevance of the intervention to the needs of the subject population.
- Coherence with the humanitarian principles of humanity, universality, impartiality, neutrality, independence, consent and participation, and respect for international standards of humanitarian intervention; and compatibility of the intervention with other interventions in the territory, sector and organisation.
- Effectiveness: The extent to which the intervention achieved its objectives and results.
- Efficiency: The extent to which the intervention delivers/has delivered results in an economic and timely way, and the adequacy of the resources used to achieve objectives and results.
- Impact: The extent to which the intervention generates/has generated significant positive or negative, intended or unintended, higher-level effects.
- Connectivity of the project and the degree to which the intervention takes into account interrelated and longer-term issues and the sustainability of the benefits generated by the intervention
- Coverage of the project and the degree of implementation of the beneficiary population in the actions carried out.
- Coordination and harmonization of the project with the other interventions that are developed in the area



6. Products to be delivered and reporting requirements

Three blocks of products should be delivered under the present ToRs:

Block 1: Overall evaluation report on ACPP's Humanitarian Strategy in Palestine, and based on this, seven separate evaluation reports for specific projects that form part of this Strategy.

Block 2: Overall monitoring, evaluation, accountability, and learning (MEAL) system for ACPP's Humanitarian Strategy in Palestine.

Block 3: Needs assessment for the next phase of ACPP's Humanitarian Strategy in Palestine, for the period 2022-2023.

Block 1: Overall programmatic evaluation report on ACPP's Humanitarian Strategy in Palestine, and seven separate evaluation reports for specific projects that form part of this Strategy

Under this block, an overall, programmatic evaluation report on ACPP's Humanitarian Strategy in Palestine should be produced, from which will then be extracted seven separate evaluation reports on specific projects that form part of this Strategy. The field work for these seven separate evaluation reports can be grouped into three phases, based on the project end dates and final reporting dates, as indicated in the table below:

Proposed phase	Donor and year of call for proposals	Project end date	Maximum date by which final evaluation report should be presented to ACPP	Communities targeted by the project	Indicative fieldwork dates
1	Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) 2017	30/06/2020	16/03/2021	Deir Istiya, Qarawat Bani Hassan	January-February 2021
2	Generalitat Valenciana (GVA) 2018	15/02/2021	01/08/2021	Kafr ad Dik, Bruqin	April-June 2021
	Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) 2017	18/04/2021	04/10/2021	Jit, Jinsafut	
	Agencia Extremeña De Cooperación Internacional Para el Desarrollo (AEXCID) 2018	08/05/2021	24/10/2021	Deir Ballout, Bruqin	



Proposed phase	Donor and year of call for proposals	Project end date	Maximum date by which final evaluation report should be presented to ACP	Communities targeted by the project	Indicative fieldwork dates
	Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) 2016	15/05/2021	04/11/2021	Halhoul, Deir Al Asal	
	Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) 2018	18/06/2021	04/12/2021	Kafr ad Dik, Bruqin	
3	Generalitat Valenciana (GVA) 2019	16/09/2021	23/02/2022	Rafat, Bruqin	September 2021

Ideally, the overall, programmatic evaluation report would be developed first, from which the seven project evaluation reports would then be extracted. However, due to reporting deadlines, the process cannot evolve in this way, given that the first product to be delivered under the contract is the evaluation report of the Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) 2017 project, which has to be finalised for presentation to the donor by **16/03/2021**.

As such, ACP proposes the following two possible processes for the products to be delivered under the block:

1. Deliver the project evaluation reports as per the dates indicated in the table above, and from these reports, draw together the overall, programmatic evaluation report on ACP's Humanitarian Strategy, to be delivered at the end of the process.
2. Given that the date of delivery of the second project evaluation report is 01/08/2021, this will give the Consulting Team time to develop the programmatic evaluation report from March to July 2021, from which the following 6 project evaluation reports could be extracted.

The Consulting Team may propose an alternative process, as long as all reporting deadlines are met.

In terms of the timeline of this Block, **work on the first project evaluation report (ACCD 2017) should begin immediately upon the awarding of the contract** (mid-December 2020), in order to finalise the report by **16/03/2021**. The fieldwork for the second phase of projects to be evaluated can be carried out jointly, from April to June 2021 for example, and fieldwork for the last project to be evaluated in September 2021.

The last evaluation report (GVA 2019) should be delivered by the Consulting Team by the end of the duration of the contract (approximately: 29/12/2020 to 29/11/2021).



Given that the seven separate evaluation reports to be delivered correspond to specific projects, with specific donor guidelines (although 6/7 of the projects are funded by two donors – GVA and AACID), the context of each report may vary slightly.

- In the case of the project funded by the Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, **the project evaluation report delivered by the Consulting Team must comply with the provisions of ACCD guidelines for grants awarded in 2017.**
- In the case of projects funded by the Generalitat Valenciana, **all products to be delivered by the Consulting Team must comply with the provisions of the GVA's Guide for the monitoring and evaluation of projects in the field of Development Cooperation.**¹
- In the case of the projects funded by the Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, **all products to be delivered by the Consulting Team must comply with the provisions of Article 46 of the Regulatory guidelines for grants to NGOs (Order of June 21, 2016)**², and with the standard provisions of the AACID's Terms of reference for the provision of final evaluation services.³

A detailed evaluation plan should be provided by the Consulting Team upon the awarding of the contract, containing:

- Objectives and scope of the evaluation
- Evaluation methodology/methodological approach
- Tools for data collection
- Data analysis methods
- Sources/a list of key informants to be consulted
- Evaluation questions
- Criteria for evaluating the results
- Topics to study
- Work plan with calendar
- Planning logframe with the evaluation criteria and questions

For each of the project evaluation reports, a preliminary evaluation report should be provided according to a calendar agreed upon by ACPP and the Consulting Team, prior to the submission of the final project evaluation reports. The purpose and content of these reports are as follows:

- Preliminary evaluation report: A first draft of the Final Report that will include all the content and information on the results that allow for an exchange between ACPP and the Consulting Team, with the opportunity for ACPP to include modifications.
- Final evaluation report: Presented in paper format (2 signed copies) and in electronic format, according to the following indicative structure⁴:
 - Cover page
 - Table of contents
 - List of acronyms
 - Executive summary

¹ <https://n9.cl/zcv4f>

² <https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/120/6>

³ https://www.juntadeandalucia.es/aacid/wp-content/uploads/2020/07/formularios_9-3_tdr_evaluacion_2016.doc

⁴ The final format, structure and content of each report should be adapted to the requirements of the donor in question.



- Introduction
- Objectives and scope
- Background and context
- Evaluation criteria and questions
- Methodology
- Conditioning factors and limits of the evaluation
- Data analysis
- Findings
- Conclusions
- Recommendations
- Lessons learned
- Actions undertaken to disseminate the findings of the evaluation
- Annexes

With regards to the structure and content of the overall, programmatic evaluation report, the above general format can be followed. However, modifications may be made by ACPP once the contract has been signed with the Consulting Team, based on the outcomes of the separate, project evaluation reports.

Indicatively, the overall, programmatic evaluation report should be completed in time (tentatively, by September 2021) to serve as a basis for the needs assessment to be conducted by the Consulting Team under Block 3 (see below).

All products must be written in Spanish, or written in English and professionally translated into Spanish (the cost of any translation will be borne by the Consulting Team, not by ACPP).

In general, the reports should not exceed 40 pages in length (not including annexes).

A workshop for the dissemination of the results of the evaluations should also be considered, aimed at the Action Group and key stakeholders at the community, regional and national levels in Palestine.

The overall, programmatic evaluation report should be delivered by the Consulting Team by the end of the duration of the contract (approximately: 29/12/2020 to 29/11/2021).

Block 2: Overall monitoring, evaluation, accountability, and learning (MEAL) plan for ACPP's Humanitarian Strategy in Palestine

To date, the implementation of ACPP's Humanitarian Strategy in Palestine has been monitored on a project basis, and no overall MEAL plan exists for the Strategy as a whole. Based on the in-depth familiarity gained by the Consulting Team through the evaluation of the Strategy, we would like them to develop a MEAL plan, in order to enhance the quality and accountability, and to demonstrate the impact of ACPP's humanitarian interventions in Palestine.

Under the supervision of the ACPP teams in Palestine and in Spain, the Consulting Team will be expected to:

- Coordinate the development of a consolidated MEAL plan for ACPP's Humanitarian Strategy in Palestine, on the basis of existing tools and methodologies, including operational guidance for its application in practice by the Action Group. This MEAL plan should provide result and impact-oriented indicators.

- Review existing information collection and management tools and processes, and provide recommendations in order to make sure that data reported is reliable and timely.
- Provide guidance to ACPP and the Action Group on adapting the MEAL plan to specific projects, as well as on developing log frames for new project proposals that incorporate (elements of) the MEAL plan, including result and impact-oriented indicators.
- As part of the MEAL plan, provide guidance to ACPP and the Action Group, including recommendations and practical steps to be undertaken in order to ensure accountability to the Strategy's target population and stakeholders.
- Facilitate a learning session with Action Group members on the content of the MEAL plan, and how it should be applied in practice.

The finalised MEAL plan should be delivered by the Consulting Team by 30/04/2021.

All products must be written in Spanish, or written in English and professionally translated into Spanish (the cost of any translation will be borne by the Consulting Team, not by ACPP).

Block 3: Needs assessment for the next phase of ACPP's Humanitarian Strategy in Palestine, for the period 2022-2023

ACPP's current Humanitarian Strategy in Palestine, operationalised through the Action Group, will take us through till the end of 2021. At this point, and based on the findings, lessons learned and recommendations of the overall, programmatic evaluation report, we would like the Consulting Team – with the full participation of the Action Group - to undertake a needs assessment to identify what ACPP and the Action Group should be doing, where, how and with whom in the period from 2022-2023, in terms of addressing the humanitarian priorities of the Palestinian population under Occupation in the West Bank.

Tentatively, the needs assessment should provide sound, quality information on the following factors, although the exact configuration of the assessment is open to discussion between ACPP and the Consulting Team, and any alternative format presented by the Consulting Team will be taken into consideration:

- Geographic area of focus
- Key stakeholders in selected communities
- General overview of the situation in target areas
- Demographic profile
- Access to services profile
- Socio-economic profile

- Humanitarian and human rights context in in target areas
- Protection-related threats facing rights holders
- Situation with regards to human rights violations and international humanitarian law violations
- Risk, capacity and vulnerability analysis of the target areas
- Duty and responsibility bearers: What are the roles and responsibilities of duty and responsibility bearers with regards to the humanitarian and human rights context in the target areas?

- Human rights claims in selected communities and affected population (gender, age, disability, refugees/displaced persons, other intersectional priorities)
- Protection
- Water and sanitation



- Livelihoods
 - Education
 - Shelter
 - Food security
 - Health/Psychosocial support
 - Specific gender-related concerns
 - Etc.
-
- Other actors addressing humanitarian and other needs in selected communities
 - Possible responses to humanitarian priorities identified, **that includes a logframe, set of activities and corresponding budget**
 - Complementarity of proposed response with local and national strategic priorities

Specific factors to take into account

- Gender relations and gender equality
- Human-rights approach
- Participation of right-holders and duty-bearers
- Intergenerational factors
- Disability
- Marginalized, disadvantaged and excluded groups
- Cultural diversity
- Environmental considerations, and environmental sustainability
- Strengthening of institutions
- Disaster risk reduction
- Nexus approach
- Community engagement (Accountability to Affected People)

Humanitarian principles

- Humanity
- Neutrality
- Impartiality
- Independence

Suggested methodology: To be proposed by the Consulting Team.

The finalised needs assessment should be delivered by the Consulting Team by the end of the duration of the contract (approximately: 29/12/2020 to 29/11/2021).

All products must be written in Spanish, or written in English and professionally translated into Spanish (the cost of any translation will be borne by the Consulting Team, not by ACPP).



7. Methodology

Block 1: Overall programmatic evaluation report on ACPP's Humanitarian Strategy in Palestine, and seven separate evaluation reports for specific projects that form part of this Strategy

As indicated in Section 6 of the present ToRs, in order to concentrate the fieldwork for the different project evaluations, ACPP proposes that it be undertaken in three phases.

In terms of the methodological steps to be carried out in general/per project evaluation, ACPP will take into consideration the methodological proposal made by the Consulting Team, according to the points outlined in Section 6 of the present ToRs. By way of guidance, we suggest that any proposed methodology for the elaboration of the evaluation reports takes into account the steps outlined below. The time dedicated to each step is to be proposed by the Consulting Team.

Phase 1: Inception and desk review phase

- A. Approach to the evaluation
- B. Evaluation design
- C. Desk review

The available documentation related to the formulation, design, implementation and management of the projects to be evaluated, as well as any other relevant information, will be analysed. The information will mainly be provided by ACPP, the Action Group, and the relevant donor organizations. The methodological proposal for the evaluations should be developed by the Consulting Team, and the work tools defined and agreed upon.

Please note that the large majority of project documentation is in Spanish, and will not be translated into any other language by ACPP. Therefore, the Consulting Team must have Spanish language capacity.

Phase 2: Field work phase

- D. Field work

The Consulting Team will contact key informants and directly collect their perception and assessments of the different interventions undertaken. The evaluation team must inform ACPP of any incident that occurs during the field work phase that prevents or alters the implementation plan and, in such case, anticipate the corrective mechanisms.

Phase 3: Analysis phase, feedback on results and preparation of the evaluation reports

- E. Data and information analysis

The fieldwork will be completed with an exhaustive study of the administrative and technical documentation on which the different actions carried out and their results were based, and will be triangulated with data and assessments from other sources.

At the end of the fieldwork, the Consulting Team will schedule a final meeting with the ACPP to involve them and discuss the first results and conclusions drawn during the fieldwork.

- F. Preliminary report

The Consulting Team must deliver draft final evaluation reports within a period to be established jointly by ACPP and the Consulting Team. The draft reports will be discussed by all parties, and contributions and/or modifications to the document, where appropriate, will be incorporated.



G. Final report

The writing of the final report must comply with the points outlined in Section 6 of the present ToRs, and its main conclusions must be discussed with all the parties involved.

Block 2: Overall monitoring, evaluation, accountability, and learning (MEAL) plan for ACP's Humanitarian Strategy in Palestine

To be proposed by the Consulting Team, according to the points outlined in Section 6 of the present ToRs.

Block 3: Needs assessment for the next phase of ACP's Humanitarian Strategy in Palestine, for the period 2022-2023

To be proposed by the Consulting Team, according to the points outlined in Section 6 of the present ToRs.



8. Workplan

Block/phase/activity	12/20	1/21	2/21	3/21	4/21	5/21	6/21	7/21	8/21	9/21	10/21	11/21
Block 0: Management of contract												
Signing of contract between ACPP and Consulting Team, and first payment made	X											
Second payment				X								
Third payment									X			
Fourth payment											X	
Final payment and end of contract												X 29/11
Block 1: Overall programmatic evaluation report on ACPP's Humanitarian Strategy in Palestine, and seven separate evaluation reports for specific projects that form part of this Strategy												
Phase 1: Inception and desk review phase	X	X			X	X				X		
Phase 2: Field work phase		X	X				X			X		
Phase 3: Analysis phase, feedback on results and preparation of the evaluation report			X					X		X		
Delivery of ACCD 2017 project evaluation report				X 16/03								
Delivery of GVA 2018, AACID 2017, AEXCID 2018, AACID 2016 and AACID 2018 project evaluation reports (indicative date)									X 01/08			
Delivery of GVA 2019 project evaluation reports (indicative date)											X 01/10	



Block 2: Overall monitoring, evaluation, accountability, and learning (MEAL) plan for ACP's Humanitarian Strategy in Palestine	Timing and methodology to be proposed by the Consulting Team. Final product to be delivered by 30/04/2021.							
Block 3: Needs assessment for the next phase of ACP's Humanitarian Strategy in Palestine, for the period 2022-2023						Timing and methodology to be proposed by the Consulting Team. Final product to be delivered by 29/11/2021 .		



9. Budget

The maximum amount available for the present contract is **70,450 euros** (seventy thousand four hundred and fifty euros), all costs (VAT etc.) included

Payment of the contract will be made according to the timings indicated in the table above, in section 8, which correspond with the delivery of the different products. Payments will be made by bank transfers, after the issuance of an invoice by the Consulting Team.

It is important to note that separate invoices will be requested for the following products to be delivered under the contract:

- ACCD 2017 project evaluation
- GVA 2018 project evaluation
- AACID 2017 project evaluation
- AEXCID project evaluation
- AACID 2016 project evaluation
- AACID 2018 project evaluation
- GVA 2019 project evaluation
- MEAL plan

10. Content of offers

Offers can be presented in Spanish or in English, with no need to present a translation in Spanish at the time of submission. However, any offer presented in English, if selected as the winning proposal, should be translated into Spanish by the Consulting Team as a contractual obligation, upon the signing of the contract.

Offers must include a technical offer and a financial offer, either in the same document or in separate documents, clearly marked.

The **Technical offer** must include the following documents:

A. Methodological proposals for the three Blocks of products to be delivered under this contract:

Block 1: Overall programmatic evaluation report on ACPP's Humanitarian Strategy in Palestine, and seven separate evaluation reports for specific projects that form part of this Strategy

The selected Consulting Team must present a methodological proposal that contains at least the following contents:

- A justification of the relevance of the proposed evaluation to the program and the intervention context.
- A list of the products to be delivered and their content.
- A list of key informants, indicating their relevance to the evaluation.
- A detailed schedule with the action plan.



- An evaluation planning matrix, which includes: evaluation criteria, evaluation questions for each criterion, information sources for each question, tools to be used to collect the information in question, and key indicators for each criterion.

The evaluation proposal should necessarily incorporate the use of participatory methodologies that allow for the reflection of the points of view of key actors involved in the program. In addition, age, gender, diversity (AGD) and Human Rights approaches should be incorporated throughout the data collection process.

The proposed methodology should combine quantitative and qualitative tools and information, and adopt a summative approach, where triangulation is used to combine and contrast information from all sources. Specifically, some of the tools to be used can include the following:

- Documentary analysis of reports and other records.
- In-depth semi-structured interviews, individual and group.
- Focus group discussions with women and girls, and men and boys rights holders targeted under the program.
- Anonymous questionnaires for team members from the different organisations that make up the Action Group, and for rights holders targeted under the program.

Block 2: Overall monitoring, evaluation, accountability, and learning (MEAL) plan for ACPP’s Humanitarian Strategy in Palestine

Suggested methodology to be proposed by the Consulting Team.

Block 3: Needs assessment for the next phase of ACPP’s Humanitarian Strategy in Palestine, for the period 2022-2023

Suggested methodology to be proposed by the Consulting Team.

- B. CVs of the members of the Consulting Team, in order to assess the experience and adequacy of their profiles to the expectations of the contract.
- C. If the Consulting Team is a company, an institutional CV must be provided together with the CVs of individual team members, demonstrating its experience.

The **Financial offer** must be presented as an amount in euros, and should be broken down according to the three Blocks of products to be delivered under the contract.

11. Requirements and selection criteria of the Consulting Team (natural or legal person)

Given the scale of the contract, the Consulting Team should consist of a minimum of two people, who must meet the following requirements:

- At least one member of the team must have at least 5 years of accredited experience in the humanitarian field (at least 5 evaluations prepared, of which 3 must refer to the country of intervention and / or the sector of action).
- At least one member of the team must have at least 5 years of accredited experience of the evaluation of humanitarian projects/programs.



- At least one member of the team must have demonstrated knowledge and experience of the Palestinian context.
- At least one member of the team must have a proven track record of delivering similar products to those required under the present ToRs.
- A proven understanding and experience of localisation, the Nexus approach and consortia work is strongly desirable.
- Experience in the sectors of protection, livelihoods, WASH and/ or psychosocial support is desirable.
- The team members must be willing to engage with Israeli human rights organisations sub-contracted by ACPP to implement components of its Humanitarian Strategy.
- The team members must not have had a working relationship with ACPP, the Action Group or the Generalitat Valenciana since 15/07/2019.
- It is essential that the Consulting Team engage at least one local team member, fluent in Arabic.
- It is essential that at least one member of the Consulting Team be fluent in Spanish, given that the majority of project documentation is in Spanish and will not be translated into any other language.
- It is essential that at least one member of the Consulting Team have good knowledge of English.

The contracted Consulting Team must understand and comply with the provisions of ACPP's Code of Conduct (see Annex 3). Upon the awarding of the contract, it will be required to submit a written Statement of Intent with regards to its adherence to ACPP's Code of Conduct and how it will be implemented during the contract period.

12. Submission of offers

Offers should be presented by **Monday 28 December 2020 at 12:00 CET** at the very latest. Any offer received after this date/time will be automatically rejected.

Offers should be sent by e-mail with the Subject: *"Offer for external services to support ACPP's Humanitarian Strategy in Palestine"*, to the following address:

orientemedio@acpp.com

Offers can be presented in Spanish or in English, with no need to present a translation in Spanish at the time of submission. However, any offer presented in English, if selected as the winning proposal, should be translated into Spanish by the Consulting Team as a contractual obligation, upon the signing of the contract.

13. Queries

Any queries or questions regarding the ToRs can be sent in written form to the e-mail address indicated in section 12, until **Wednesday 16 December 2020** at the latest.

14. Evaluation of offers

The offers received will be evaluated by a Committee made up of an odd number of ACPP staff.

The criteria for assessing the quality of the proposal are as follows:



Criteria	Maximum score
Organisation and methodology	
Rationale	10
Strategy	25
Timetable of activities	15
Total score for organisation and methodology	X/50
Consulting Team qualifications and experience	
Qualifications and skills	10
General professional experience	15
Specific professional experience	25
Total score for consulting Team qualifications and experience	X/50
Overall total score	<u>100</u>

The evaluation process and the awarding of the contract will be carried out according to ACPP's Goods and Services Procurement Manual (see Annex 4).

15. Premises of the evaluation, authorship and publication

The natural or legal person hired as part of the contract to be signed under the present ToRs must respect human rights and be sensitive to the considerations of gender, ethnic origin, age, sexual orientation, language, cultural differences, customs, beliefs and religious practices of all the agents involved in the work to be conducted under the contract.

The integrity, independence, credibility and transparency of the evaluation must be ensured. The natural or legal person in charge of carrying out the contract must work freely and without interference, and access all available information, under the premises of ethical and professional behaviour.

The anonymity and confidentiality of the people participating in the evaluation must be guaranteed.


The members of the Consulting Team will delegate all authorship rights to ACPP who, if deemed appropriate, may proceed to the publication of the products delivered under the contract, in which case the Consulting Team will be mentioned as authors of the document.

As an additional mechanism for disseminating the conclusions, ACPP may request the coordinator of the Consulting Team and/or one of its members to present the results and lessons obtained from the products delivered under the contract, in work sessions with staff from certain donor organisations and/or other NGOs. The dissemination of any information collected under the contract is the prerogative of ACPP and its consent must be sought before this is done.

These ToRs will be contractual and may not be unilaterally modified. Modification of these terms may be cause for the termination of the contract awarded by ACPP, without grounds for compensation.




Annex 1a: Map of Action Group target communities in the Governorate of Hebron

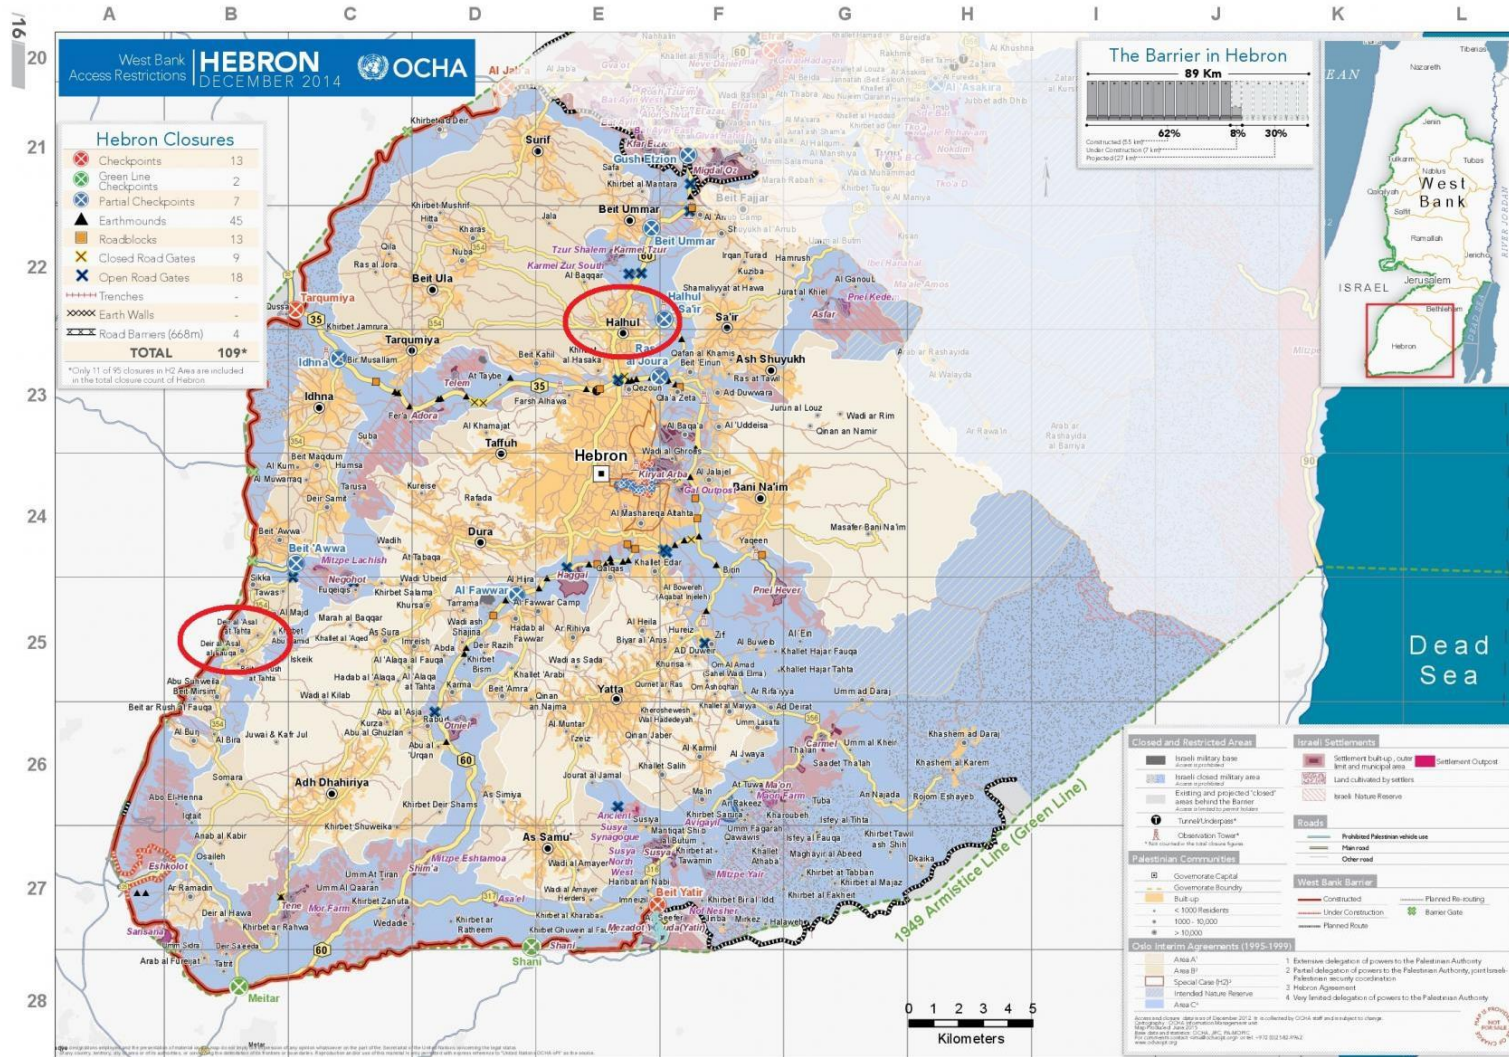




Annex 1b: Map of Action Group target communities in the Governorate of Salfit

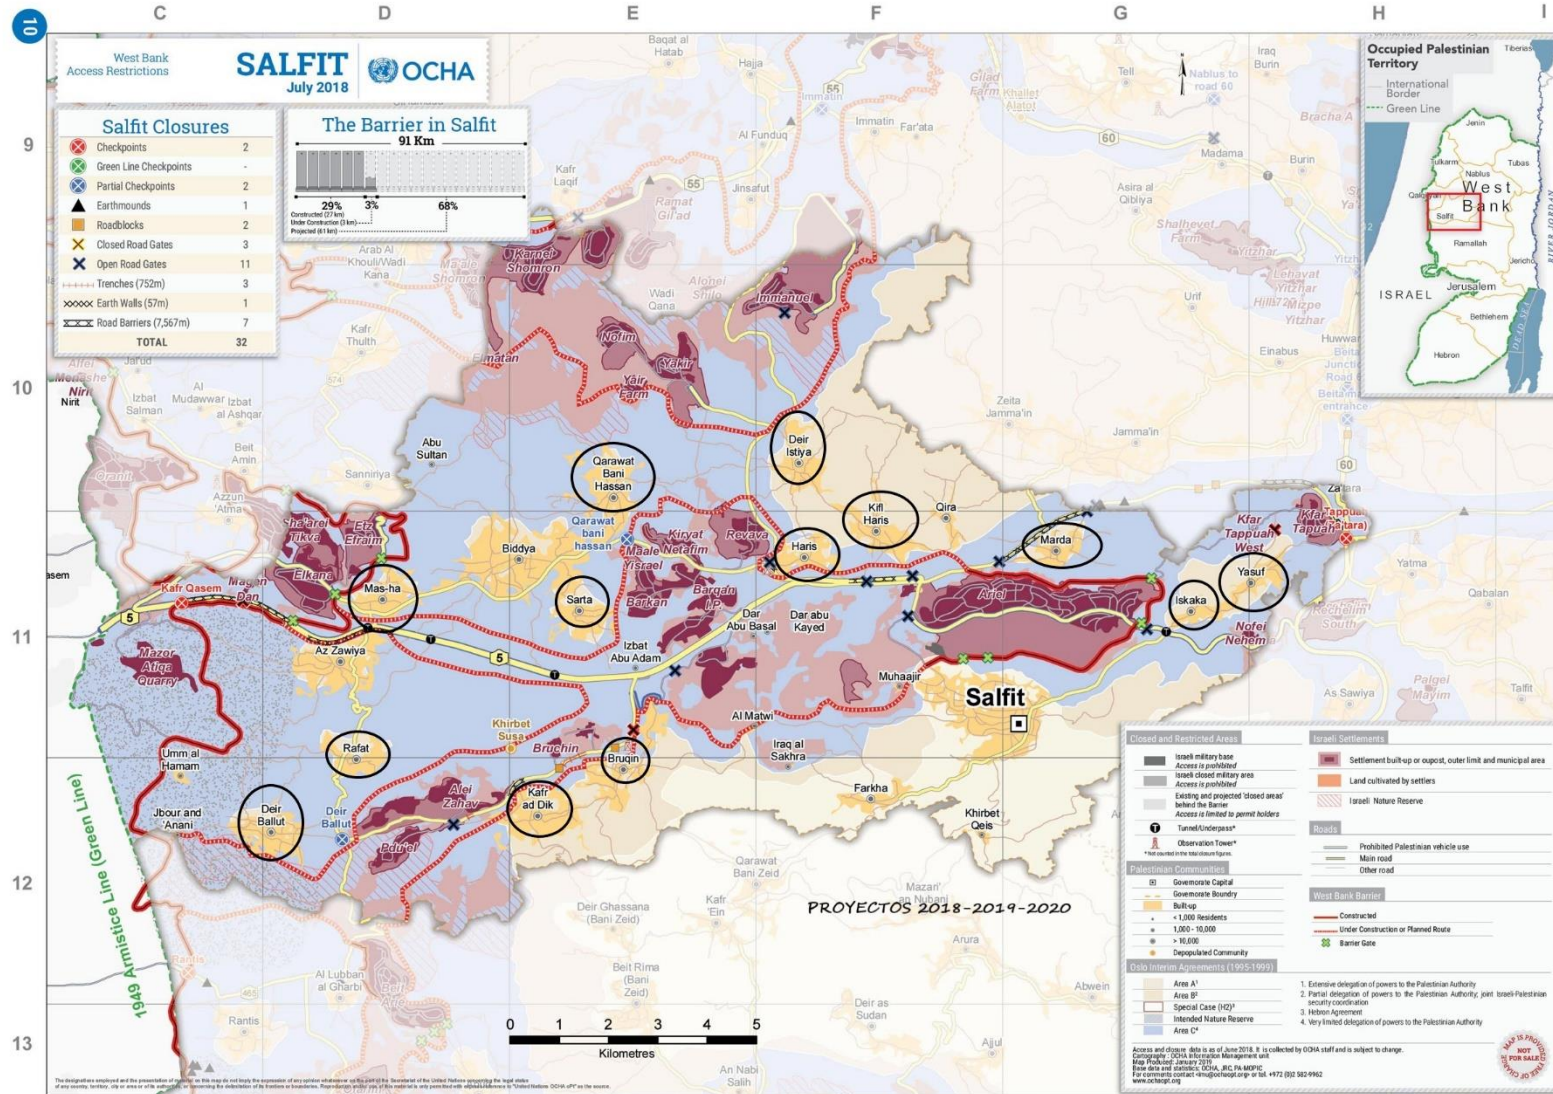



Annex 1c: Map of Action Group target communities in the Governorate of Qalqiliya

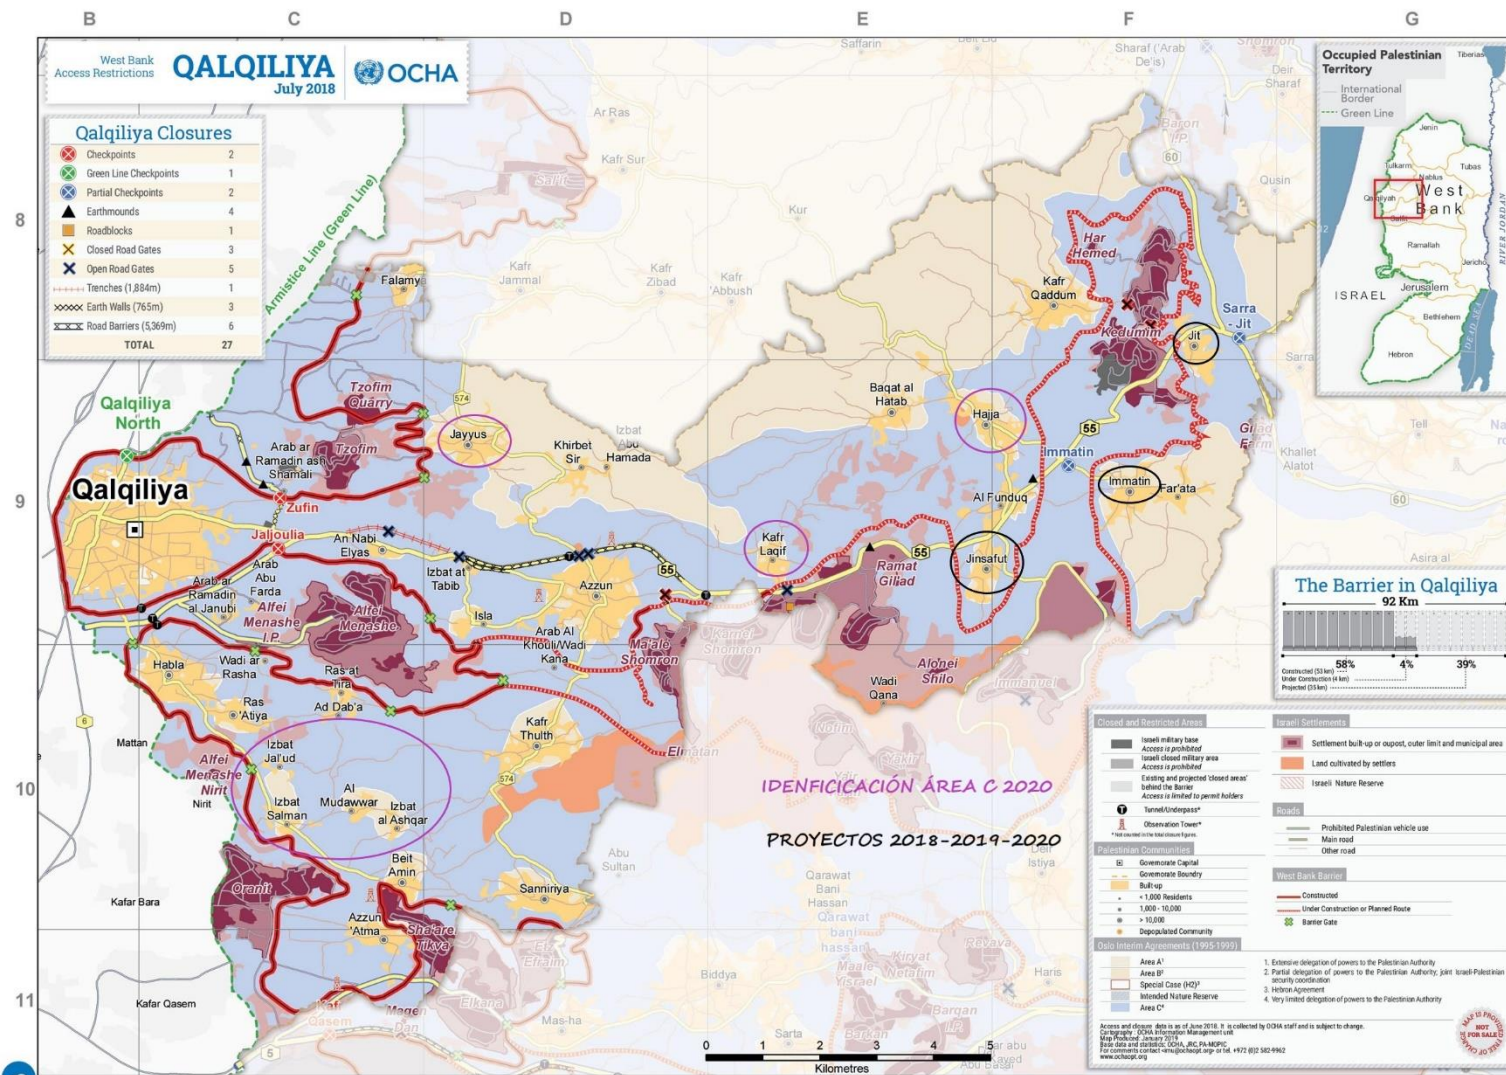

Annex 2a: ACCD 2017 project sheet

INSTITUCIÓN Y AÑO DE CONVOCATORIA:	Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) 2017
ENTIDAD BENEFICIARIA:	Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP)
ENTIDAD LOCAL SOCIA:	Agricultural Development Association (PARC) Psycho-Social Counseling Center for Women (PSCCW)
TÍTULO DE LA INTERVENCIÓN:	Defensem els drets de la població palestina davant les vulneracions de DIH i DIDH
LOCALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN:	Deir Istiya, Qarawat Bani Hassan, Salfit, Cisjordania, Palestina
SUBVENCIÓN OTORGADA:	500.000,00 €
COSTE TOTAL:	629.419,45 €
FECHA DE INICIO:	15/02/2018
FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN:	30/06/2020
PERIODO A EVALUAR:	15/02/2018-30/06/2020

Objetivos, resultados e indicadores esperados

OG: Mitigar el impacto de las crisis asociadas con vulneraciones de DIH /DDDH de 8.429 personas (4.078 mujeres y 4.351 hombres), en las comunidades de Palestina.
IOVOG.1: 67 familias ven mejorada su acceso a los Derechos económicos. IOVOG.2: El CPC de Qarawat Bani Hassan ve mejorado su posicionamiento para hacer frente a riesgos.
OE: Contribuir al acceso a los derechos económicos y mejorar la resiliencia y la protección (principalmente de las mujeres) de las comunidades de Deir Istiya y Qarawat Bani Hassan, Zona C, Gobernación de Salfit, Cisjordania
IOVOE.1: Facilitada la rehabilitación y la protección de 20HA en Deir Istiya y Qarawat Bani Hassan. IOVOE.2: 30 mujeres de grupos de base comunitaria son capacitadas en la promoción de la agenda política en equidad de género y derechos humanos. IOVOE.3: 4 reuniones europarlamentarios realizadas
R1: En el mes 15, se habrá proporcionado a las 40 familias de las comunidades de Deir Istiya y Qarawat Bani Hassan las facilidades para mejorar sus medios de vida y acceder al cumplimiento de sus derechos económicos
IOVR.1.1 20HA de tierras agrícolas en Deir Istiya y Qarawat Bani Hassan rehabilitadas, limpiadas y aradas. IOVR.1.2: 20HA muros protectores construidos al lado de las tierras de Deir Istiya y Qarawat Bani Hassan IOVR.1.3: 10 Cisternas para la recogida de agua de lluvia construidas en las poblaciones de Qarawat Bani Hassan y Deir Istiya. IOVR.1.4: 32 horas formativas en técnicas agrícolas por 30 hombres y 30 mujeres de Deir Istiya y Qarawat Bani Hassan
R2: En el mes 24, se habrán fortalecido los aspectos comunitarios de la resiliencia de los titulares de derechos de Qarawat Bani Hassan y Deir Istiya.
IOVR.2.1: Al menos un 60% de la población encuestada de Qarawat Bani Hassan valora positivamente el nivel de preparación de la comunidad frente al desastre. IOVR.2.2: 2 grupos de mujeres son capacitadas en la promoción de la agenda política en equidad de género y derechos humanos. IOVR.2.3: 120 personas reciben apoyo psicosocial a través de terapias grupales
R3: En el mes 24, se llevarán a cabo actividades de incidencia pública ante la opinión pública israelí e incidencia política con las instituciones europeas sobre los derechos del pueblo palestino y las causas estructurales de su vulneración
IOVR.3.1: Una campaña de incidencia pública realizada en Palestina IOVR.3.2: Dos campañas de investigación y difusión realizadas en Israel sobre las violaciones de DDHH del pueblo palestino

Actividades

A.1.1: Restauración de medios de vida rurales: Acciones de rehabilitación, limpieza y arado.

A.1.2. Construcción de Muros, vallas protectoras y plantación de tierras.

A.1.3. Construcción de cisternas agrícolas.

A.1.4. Realización de formaciones en mejoras sobre técnicas agrícolas y en gestión de los recursos hídricos.

A.2.1. A.2.1. Fortalecimiento y ampliación del Comité de Protección Comunitaria (CPC), ya existente en Qarawat Bani Hassan: Incorporación del enfoque de RRD (Reducción de Riesgo de Desastre), género, protección a la infancia y protección a las personas con discapacidad.

A.2.2. Apoyo a organizaciones de base comunitaria de mujeres, como agentes clave en la promoción de la agenda de equidad de género y los DDHH de las mujeres a las dos comunidades de intervención.

A.2.3. Apoyo psicosocial a niños y niñas, y mujeres y hombres, atendiendo a las necesidades diferenciadas en función de su género en Dear Istiya y Qarawat Bani Hassan.

A.3.1. Realización de una campaña nacional de incidencia pública para mejorar el acceso al cumplimiento de los DDHH del pueblo palestino.

A.3.2. Realización de dos campañas de monitorización y difusión sobre los asentamientos israelíes y de documentación y difusión de casos de violaciones de DIH / DIDH a Palestina.

A.3.3. Incidencia en Parlamento Europeo en Bruselas.

Annex 2b: GVA 2018 project sheet

INSTITUCIÓN Y AÑO DE CONVOCATORIA:	Generalitat Valenciana (GVA) 2018
ENTIDAD BENEFICIARIA:	Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP)
ENTIDAD LOCAL SOCIA:	Agricultural Development Association (PARC) Psycho-Social Counseling Center for Women (PSCCW)
TÍTULO DE LA INTERVENCIÓN:	Protección de los derechos y la dignidad de la población palestina bajo ocupación conforme al DIH y el DIDH, con especial énfasis en la lucha contra la violencia de género, la protección de la infancia y la reducción del riesgo de desastres (RRD).
LOCALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN:	Bruqin y Kafr ad Dik, Salfit, Cisjordania, Palestina
SUBVENCIÓN OTORGADA:	142.100,00 €
COSTE TOTAL:	179.600,00 €
FECHA DE INICIO:	15/07/2019
FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN:	15/02/2021
PERIODO A EVALUAR:	15/07/2019-15/02/2021

Objetivos, resultados e indicadores esperados

OG: Contribuir a la protección de los derechos y la dignidad de la población palestina bajo ocupación conforme al DIH y el DIDH, con especial énfasis en la lucha contra la violencia de género, la protección de la infancia y el RRD
OE: Prevenir y mitigar el impacto de riesgos humanitarios y las crisis asociadas con violaciones de DIH/DIDH sobre los derechos y la dignidad de 3.926 personas (1.906 mujeres/niñas, 2.020 hombres/niños), Zona C, Salfit, Cisjordania, Palestina
OE1.IOV1: Reforzada la resiliencia de 50 familias vulnerables (250 personas: 123 mujeres y niñas, 127 hombres y niños) frente a amenazas a sus medios de vida, dignidad y derechos de propiedad, y los impactos humanitarios de las mismas, Zona C, Kafr ad Dik y Bruqin, mes 12
OE1.IOV2: Potenciada la capacidad de respuesta de 4.011 personas (1.947 mujeres/niñas, 2.064 hombres/niños) vulnerables a violaciones de DIH/DIDH para reivindicar sus derechos ante violaciones y desastres, Zona C, Bruqin, mes 12
OE1.IOV3: Fomentada la protección de los derechos de 1.019 niñas y 1.079 niños vulnerables a violaciones de DIH/DIDH conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño, Zona C, Kafr ad Dik y Bruqin, mes 12
OE1.IOV4: Impulsada la protección de los derechos de 888 mujeres, y 941 hombres vulnerables ante distintos tipos de violencia en función del género, Zona C, Kafr ad Dik y Bruqin, mes 12
OE1.IOV5: Impulsado el proceso de transformación de políticas y prácticas por parte de los titulares de obligaciones que permiten continuadas violaciones de DIH/DIDH contra la población palestina bajo ocupación, mes 12
R1: Restablecidas y potenciadas las capacidades productivas de 50 hogares vulnerables (250 personas: 123 mujeres y niñas, 127 hombres y niños) cuyos medios de vida están amenazados, Zona C, Kafr ad Dik y Bruqin, Salfit, mes 12
R1.IOV1: Creado un mecanismo de rendición de cuentas para presentación de reclamaciones por parte de la población destinataria de las actividades relacionadas con los medios de vida, de acuerdo con la Norma Esencial Humanitaria nº 5, Kafr ad Dik y Bruqin, mes 2
R1.IOV2: Recuperados los medios de vida de 33 familias (80 mujeres/niñas, 85 hombres/niños) que dependen de tierras agrícolas vulnerables a la confiscación en Zona C, Bruqin, mes 12
R1.IOV3: Protegido el cultivo de 17 familias agricultoras (85 personas: 41 mujeres y niñas, 44 hombres y niños) sobre 5 HA de tierras agrícolas en Zona C, de amenazas humanas y/o naturales, Kafr ad Dik, mes 12



R1.IOV4: Generados 8.437 euros de ingresos para aproximadamente 30 familias vulnerables (73 mujeres y niñas, 77 hombres y niños) en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en el acceso a trabajo por dinero, Kafr ad Dik y Bruqin, mes 12

R1.IOV5: Apoyadas 25 mujeres agricultoras en el sostenimiento de sus medios de vida agrícolas en tierras vulnerables a la confiscación en Zona C, Kafr ad Dik y Bruqin, mes 12

R1.IOV6: 8 mujeres y 7 hombres tienen igualdad de acceso a formación sobre mejores técnicas agrícolas, la agricultura ecológica, la gestión de los recursos hídricos y las prácticas eficaces de riego, Kafr ad Dik y Bruqin, mes 12

R2: Mejorado el posicionamiento de 25 personas (13 mujeres, 12 hombres) para hacer frente a riesgos que afectan al cumplimiento de los derechos de 3.926 personas (1.906 mujeres y niñas, 2.020 hombres y niños) vulnerables a violaciones de DIH/DIDH y desastres, Bruqin, Salfit, mes 12

R2.IOV1: Elaborado de forma participativa e igualitaria un Plan de Protección y RRD comunitario por el Comité de Protección Comunitaria (CPC), y diseminado el mismo en Bruqin, mes 12

R2.IOV2: Creado un Comité de Protección Comunitario (CPC) en Bruqin para la Reducción del Riesgo de Desastres naturales y humanos, y para monitorear, documentar y reportar sobre violaciones de DIH/DIDH, mes 12.

R2.IOV3: Fomentada la participación de mujeres en el CPC de Bruqin, y la inclusión en su labor en la consecución de objetivos de género basados en el análisis de los diferentes riesgos y capacidad de respuesta de mujeres y hombres, mes 12.

R2.IOV4: Capacitados 13 mujeres y 12 hombres integrantes del CPC en Bruqin en un extenso programa de formación diseñado para fomentar la resiliencia, el empoderamiento y la movilización de la comunidad ante violaciones de DIH/DIDH, mes 12.

R2.IOV5: Integrado un componente específico sobre los derechos de las personas con diversidad funcional y/o con otras vulnerabilidades especiales en la formación de las 25 personas integrantes del CPC en Bruqin, mes 12.

R2.IOV6: Impulsado el reconocimiento entre la población de Bruqin del CPC como organización de la sociedad civil en la prevención y respuesta ante desastres y violaciones, y fortalecidas sus enlaces con otros CPCs, mes 12.

R2.IOV7: Identificados y abordados riesgos que suponen una amenaza para la seguridad y el bienestar de 4.011 personas (1.947 mujeres/niñas, 2.064 hombres/niños), y para la protección medioambiental en Bruqin, mes 12.

R2.IOV8: Diseñado un sistema para informar sobre los incidentes de violaciones de DIH/DIDH que se producen en Bruqin por el que el 80% de los incidentes documentados por el CPC son denunciados y/o remitidos a terceros para apoyo adicional, mes 12.

R3: Fomentada la protección de 1.019 niñas y 1.079 niños ante violaciones sistemáticas de sus derechos, en Kafr ad Dik y Bruqin, mes 12

R3.IOV1: Capacitados 25 integrantes (13 mujeres, 12 hombres) del CPC de Bruqin sobre la Convención sobre los Derechos del Niño, y principales instrumentos del Derecho Internacional y sistemas nacionales de protección de la infancia, mes 12.

R3.IOV2: Integrados los mecanismos internacionales y nacionales de protección infantil en el trabajo de identificación, monitoreo y denuncia desarrollado por los 25 miembros (13 mujeres, 12 hombres) del CPC de Bruqin, mes 12.

R3.IOV3: Apoyados 30 alumnas y 30 alumnos que presenten síntomas de angustia psicosocial, mediante 40 sesiones de terapia de grupo aplicando el enfoque de Terapia Cognitivo-Conductual, en 4 colegios públicos en Kafr ad Dik y Bruqin, mes 12.

R3.IOV4: Asistido el profesorado (20 mujeres, 20 hombres) de 4 colegios públicos en Kafr ad Dik y Bruqin en el desarrollo de sus conocimientos y habilidades en el trato con alumnos/as que presenten síntomas de estrés psicosocial, mes 12.

R3.IOV5: Apoyados 29 madres y 31 padres en el desarrollo de sus conocimientos y habilidades en el trato con menores que presenten síntomas de angustia psicosocial a raíz de rupturas en el Ambiente Protector, en 4 colegios públicos en Kafr ad Dik y Bruqin, mes 12.

R4: Fomentada la protección de 1.829 adultos, con especial énfasis sobre 888 mujeres, ante violaciones sistemáticas de sus derechos, Kafr ad Dik y Bruqin, Salfit, mes 12

R4.IOV1: Capacitados los 25 integrantes (13 mujeres, 12 hombres) del CPC de Bruqin sobre CEDAW, y la violencia sexual y de género, mes 12.

R4.IOV2: Integrados los mecanismos de protección de los derechos de la mujer y de lucha contra la violencia sexual y de género en el trabajo de identificación y respuesta de los 25 miembros (13 mujeres, 12 hombres) del CPC de Bruqin, mes 12.

R4.IOV3: Apoyadas 40 mujeres y 20 hombres supervivientes de violencia de género y/u otros traumas mediante servicios de apoyo psicosocial, en función de sus diferentes vulnerabilidades y necesidades basadas en el género, en Kafr ad Dik y Bruqin, mes 12.

R4.IOV4: 40 mujeres supervivientes de violencia de género y/u otros traumas apoyadas con terapias grupales muestran mejores capacidades para afrontar el estrés psicosocial, Kafr ad Dik y Bruqin, mes 12.

R4.IOV5: 20 hombres ex detenidos por las fuerzas militares y/o con otros traumas apoyados con terapias grupales muestran mejores capacidades para afrontar el trauma relacionada con su experiencia en prisión, Kafr ad Dik y Bruqin, mes 12.

R5: 100.000 titulares de responsabilidades son conscientes de los factores estructurales que provocan violaciones de DIH/DIDH en la Zona C para su posterior influencia en los titulares de obligaciones y en las políticas y prácticas que lo permiten, mes 12

R5.IOV1: Estudios basados en cartografía e imágenes aéreas realizados por Peace Now permiten el monitoreo de la expansión de asentamientos y puestos de avanzada israelíes en Cisjordania, con un enfoque específico sobre la región de Salfit, mes 12.

R5.IOV2: 100.000 personas, principalmente adultos jóvenes israelíes, cuentan con mayor conocimiento sobre los asentamientos y los puestos de avanzada israelíes como causa estructural de violaciones de los derechos de la población palestina en Zona C, mes 12.

R5.IOV3: Facilitado el acceso de la justicia a 5-10 víctimas palestinas de violaciones del DIH/DIH dentro del sistema legal israelí, mes 12.

R5.IOV4: Registrada información actualizada sobre violaciones de DIH/DIDH cometidas contra la población palestina por civiles/militares israelíes en Cisjordania, mes 12.

Actividades

A1.R1: Creación de un mecanismo de rendición de cuentas para la presentación de reclamaciones por parte de la población destinataria, en Kafr ad Dik y Bruqin, mes 2.

A2.R1: Rehabilitación y plantación de 10 HA de tierras agrícolas de propiedad privada palestina, sin cultivar y en riesgo de confiscación, en Bruqin, meses 10-18

A3.R1: Montaje de un vallado protector en 5 HA de propiedad privada palestina en riesgo de confiscación y bajo amenazas humanas y/o naturales en Kafr ad Dik, meses 10-14

A4.R1: Creación de oportunidades de trabajo por dinero en el sector agrícola, en Kafr ad Dik y Bruqin, meses 10-18

A5.R1: Realización de formaciones en mejores técnicas agrícolas y agricultura ecológica, y la gestión de recursos hídricos y prácticas de riego eficientes, en Kafr ad Dik y Bruqin, meses 14-15

A1.R2: Realización de talleres participativos para la incorporación de un enfoque de RRD, género, discapacidad y protección de la infancia, en el Plan de Protección y RRD comunitario a elaborar en Bruqin, meses 2-3

A2.R2: Celebración de un taller central en Bruqin para identificar colectivamente los riesgos y prioridades que deben incluirse en el Plan de Protección y RRD comunitario, e identificación de los integrantes del CPC, mes 4

A3.R2: Elaboración, impresión y distribución del Plan de Protección y RRD comunitario en Bruqin, mes 14-17

A4.R2: Creación de un Comité de Protección Comunitario (CPC) en Bruqin, mes 4

A5.R2: Realización de 3 formaciones para el nuevo CPC en Bruqin sobre: Protección, el papel del defensor de DDHH y la aplicación del DIH y DIDH; Habilidades para documentar y reportar violaciones de DIH y DIDH; Lobbying, incidencia y comunicación, meses 4-8



A6.R2: Realización de formaciones para los CPC en Kafr ad Dik y Bruqin sobre los derechos de las personas con diversidad funcional y/o otras vulnerabilidades especiales, y el soporte vital básico, meses 4-8

A7.R2: Realización de formaciones para el CPC sobre la Reducción de Riesgos ante Desastres, y la extinción de incendios y seguridad, en Bruqin, meses 4-8

A8.R2: Distribución de un kit de soporte vital básico y protección al CPC, en Bruqin, mes 15

A9.R2: Realización de 2 visitas de intercambio con otros CPC en localidades del entorno, en Bruqin, meses 15-16

A10.R2: Implementación de 1 iniciativa de protección y RRD comunitaria identificada vía el Plan de Protección y Respuesta Comunitaria, en Bruqin, meses 17-19

A11.R2: Documentación y difusión por el CPC de los casos de violaciones de DIH/DIDH producidos en Bruqin sobre la base de un diseño/actualización de formato de informe, meses 11-18

A1.R3: Realización de formaciones para el CPC sobre la protección infantil y los derechos de los niños y niñas, en Bruqin, meses 4-8

A2.R3: Realización de 1 taller participativo para la incorporación de un enfoque de protección de la infancia, y que incluya actividades relacionadas, en el Plan de Protección y RRD comunitario en Bruqin, meses 2-3

A3.R3: Celebración de 1 taller central en Bruqin para identificar colectivamente los riesgos y prioridades que deben incluirse en el Plan de Protección y RRD comunitario, con enfoque de protección de la infancia, mes 4

A4.R3: Documentación y difusión por el CPC de los casos de violaciones de DIH/DIDH contra menores producidos en Bruqin, sobre la base de un diseño/actualización de formato de informe con enfoque de protección de infancia, meses 11-18

A5.R3: Realización de sesiones de terapia en grupo para alumnos/as que presenten síntomas de estrés psicosocial, en Kafr ad Dik y Bruqin, meses 3-17

A6.R3: Realización de sesiones con el profesorado para desarrollar sus conocimientos y habilidades en el trato con alumnos/as que presenten síntomas de estrés psicosocial, en Kafr ad Dik y Bruqin, meses 3-14

A7.R3: Realización de reuniones con madres y padres de niños/s que presenten síntomas estrés psicosocial, en Kafr ad Dik y Bruqin, meses 3-18

A1.R4: Realización de formaciones para el CPC sobre el papel de la mujer en la resolución de conflictos y la construcción de la paz según la Resolución 1325 de la ONU, CEDAW, y la violencia sexual y de género en Bruqin, meses 11-17

A2.R4: Realización de 1 taller participativo para la incorporación de la perspectiva de mujeres, y que incluya actividades relacionadas, en los Planes de Protección y RRD comunitarios en Bruqin, meses 3-5

A3.R4: Celebración de un taller central en Bruqin para identificar colectivamente los riesgos y prioridades que deben incluirse en el Plan de Protección y RRD comunitario, desde la perspectiva de mujeres, mes 4

A4.R4: Documentación y difusión por el CPC de los casos de violaciones de DIH/DIDH contra mujeres producidos en Bruqin, sobre la base de un diseño/actualización de formato de informe con enfoque de género, meses 11-18

A5.R4: Realización de sesiones de terapia en grupo para mujeres víctimas de violencia de género y/o que presentan síntomas estrés psicosocial, en Kafr ad Dik y Bruqin, meses 3-17

A6.R4: Realización de sesiones de terapia en grupo para hombres ex detenidos por las fuerzas militares y/o que presentan síntomas de estrés psicosocial, en Kafr ad Dik y Bruqin, meses 3-12

A1.R5: Asistencia técnica especializada en actividades de asentamientos israelíes en la zona de intervención del proyecto: Monitoreo y actualización por Peace Now de datos sobre los asentamientos y puestos de avanzada israelíes como violación del DIH/DIDH, meses 2-16

A2.R5: Asistencia técnica especializada en actividades de asentamientos israelíes en la zona de intervención del proyecto: Realización de una campaña de sensibilización por Peace Now dirigido a titulares de responsabilidades, meses 2-16



A3.R5: Servicios especializados de asistencia legal y monitoreo del acceso de la población palestina a la justicia: Registro de testimonios de víctimas afectadas por delitos contra la propiedad, delitos violentos, confiscación de tierras o daños ambientales cometidos por colonos/militares israelíes, meses 2-16

A4.R5: Servicios especializados de asistencia legal y monitoreo del acceso de la población palestina a la justicia: Registro de los casos por tipo de incidente y ubicación geográfica, y con datos desglosados por género, meses 2-16

A5.R5: Servicios especializados de asistencia legal y monitoreo del acceso de la población palestina a la justicia: Uso de datos de los casos registrados para informar a las actividades de sensibilización de Yesh Din, meses 2-16

Annex 2c: AACID 2017 project sheet

INSTITUCIÓN Y AÑO DE CONVOCATORIA:	Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) 2017
ENTIDAD BENEFICIARIA:	Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP)
ENTIDAD LOCAL SOCIA:	Agricultural Development Association (PARC) Psycho-Social Counseling Center for Women (PSCCW)
TÍTULO DE LA INTERVENCIÓN:	Acción humanitaria para la protección de los derechos y la dignidad de la población palestina bajo ocupación conforme al DIH y el DIDH, con especial énfasis en la lucha contra la violencia de género y la protección de la infancia
LOCALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN:	Jit, Jinsafut, Qalqiliya, Cisjordania, Palestina
SUBVENCIÓN OTORGADA:	300.000,00 €
COSTE TOTAL:	315.810,00 €
FECHA DE INICIO:	19/09/2019
FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN:	15/04/2021
PERIODO A EVALUAR:	19/09/2019-15/04/2021

Objetivos, resultados e indicadores esperados

OG: Contribuir a la protección de los derechos y la dignidad de la población palestina bajo ocupación conforme al DIH y el DIDH, con especial énfasis en la lucha contra la violencia de género y la protección de la infancia
OE: Prevenir y mitigar el impacto de riesgos humanitarios y las crisis asociadas con violaciones de DIH/DIDH sobre los derechos y la dignidad de 5373 personas (2635 mujeres/niñas, 2738 hombres/niños), Zona C, Qalqiliya, Cisjordania, Palestina.
<ul style="list-style-type: none"> – Reforzada la resiliencia de 67 familias palestinas vulnerables (163 mujeres/niñas, 170 hombres/niños) frente a amenazas a sus medios de vida, dignidad y derechos de propiedad, y los impactos humanitarios de las mismas, Zona C, Jit y Jinsafut, mes 12. – Potenciada la capacidad de respuesta de 5373 personas (2635 mujeres/niñas, 2738 hombres/niños) vulnerables a violaciones de DIH/DIDH para reivindicar sus derechos ante violaciones y desastres, Zona C, Jit y Jinsafut, mes 12. – Fomentada la protección de los derechos de 1255 niñas y 1302 niños vulnerables a violaciones de DIH/DIDH conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño, Zona C, Jit y Jinsafut, mes 12. – Impulsada la protección de los derechos de 1380 mujeres, y 1436 hombres vulnerables ante distintos tipos de violencia en función del género, Zona C, Jit y Jinsafut, mes 12. – Impulsado el proceso de transformación de políticas y prácticas por parte de los titulares de obligaciones que permiten continuadas violaciones de DIH/DIDH contra la población palestina bajo ocupación, mes 12.
R1: Restablecidas y potenciadas las capacidades productivas de 67 hogares vulnerables (163 mujeres/niñas, 170 hombres/niños) cuyos medios de vida están amenazados, Zona C, Jit y Jinsafut, Qalqiliya, mes 12.
<ul style="list-style-type: none"> – Creado un mecanismo de rendición de cuentas para la presentación de reclamaciones por parte de la población destinataria de las actividades relacionadas con los medios de vida, de acuerdo con la norma esencial humanitaria nº 5, Jit y Jinsafut, mes 2. – Facilitada la recuperación de 20 HA de tierras agrícolas vulnerables a confiscación en Zona C y sobre los que dependen los medios de vida de 67 familias (333 personas: 163 mujeres/niñas, 170 hombres/niños) en Jit y Jinsafut, mes 12. – Protegido el cultivo sobre 15 HA de tierras agrícolas recuperadas de amenazas humanas y/o naturales, Zona C, Jit y Jinsafut, mes 12.



- Restaurados los medios de vida de 134 agricultores, de los cuales 67 son mujeres, Zona C, Jit y Jinsafut, mes 12.
- Apoyada la continuidad de los medios de vida recuperados de 134 agricultores (67 mujeres) en Jit y Jinsafut mediante la cuidadosa selección de tierras de propiedad privada en Zona C frente a tierras declaradas estatales por Israel, mes 12.
- Optimizadas las condiciones medioambientales (estructura del suelo y retención de agua) de 6,5 HA de tierras agrícolas, Zona C, Jit y Jinsafut, mes 12.
- Generados 27.675 euros de ingresos para aproximadamente 130 familias vulnerables (650 personas: 319 mujeres/niñas, 331 hombres/niños) mediante la creación de empleo a corto plazo, Jit y Jinsafut, mes 12.
- Mujeres y hombres reciben igual salario por el mismo trabajo para las actividades de creación de empleo a corto plazo creadas a través de la intervención, Jit y Jinsafut, mes 12.
- 30 mujeres y 30 hombres tienen igualdad de acceso a formación sobre mejores técnicas agrícolas, la agricultura ecológica, la gestión de los recursos hídricos y las prácticas eficaces de riego, Jit y Jinsafut, mes 12.

R2: Mejorado el posicionamiento de 50 personas (25 mujeres, 25 hombres) para hacer frente a riesgos que afectan al cumplimiento de los derechos de 5.373 personas vulnerables a violaciones de DIH/DIDH y desastres, Jit y Jinsafut, Qalqiliya, mes 12.

- Elaborados de forma participativa e igualitaria Planes de Protección y RRD comunitarios por los Comités de Protección Comunitaria (CPC), y diseminados los mismos en Jit y Jinsafut, mes 12.
- Los Planes de Protección y RRD comunitarios incluyen objetivos de igualdad de género y se basan en el análisis de género de los diferentes riesgos, resiliencia y capacidad de respuesta de las mujeres y los hombres, mes 12.
- Creado y dotado un Comité de Protección Comunitario (CPC) en Jinsafut, para la Reducción del Riesgo de Desastres naturales y humanos, y para monitorear, documentar y reportar sobre violaciones de DIH/DIDH en la comunidad, mes 12.
- Dotado e impulsada la participación comunitaria en 1 Comité de Protección Comunitaria ya existente en Jit, para la Reducción del Riesgo de Desastres naturales y humanos, y para monitorear, documentar y reportar sobre violaciones de DIH/DIDH, mes 12.
- Fomentada la participación de mujeres en el CPC de nueva creación en Jinsafut, y la igualdad de género entre mujeres y hombres integrantes del CPC ya existente en Jit, mes 12.
- Al menos un 60% de la población encuestada en Jit y Jinsafut valora de forma positiva el nivel de preparación de las comunidades frente a violaciones de DIH/DIDH o desastres, mes 12.5
- Capacitados 25 mujeres y 25 hombres integrantes de los CPC in Jit y Jinsafut en un extenso programa de formación diseñado para fomentar la resiliencia, el empoderamiento y la movilización de la comunidad ante violaciones de DIH/DIDH, mes 12.
- Integrado un componente específico sobre los derechos de las personas con discapacidad y/o con otras vulnerabilidades especiales en la formación de las 50 personas integrantes de los CPC in Jit y Jinsafut, mes 12.
- Impulsado el papel de los CPCs de Jit y Jinsafut como organizaciones de la sociedad civil palestina, y fortalecidas sus enlaces con otros CPCs, mes 12.
- Identificados y abordados riesgos que suponen una amenaza para la seguridad y el bienestar de 5.373 personas (2.635 mujeres/niñas, 2.738 hombres/niños), y para la protección medioambiental en Jinsafut y Jit, mes 12.
- Elaborado un formato para reportar sobre los incidentes de violaciones de DIH/DIDH que se producen en Jit y Jinsafut, que integra información específica sobre discapacidad, mes 12.
- El 80% de los incidentes documentados por los CPC en Jit y Jinsafut son denunciados y/o remitidos a terceros para apoyo adicional, mes 12.
- Se fomenta la implicación de voluntarios andaluces en los CPC en Jit y Jinsafut, mes 12.

⁵ To be done with members of CPCs.



R3: Fomentada la protección de 643 niñas y 658 niños ante violaciones sistemáticas de sus derechos, Jit y Jinsafut, Qalqiliya, mes 12.

- Realizadas 32 horas de formación sobre la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos; los principales instrumentos de protección de la infancia del DI; y mecanismos y sistemas nacionales de protección de la infancia, mes 12.
- 50 miembros (25 mujeres, 25 hombres) de los CPC en Jit y Jinsafut cuentan con una mejor comprensión de los marcos, instrumentos jurídicos y mecanismos internacionales y nacionales de protección infantil, mes 12.
- Las preocupaciones relacionadas con la protección de la infancia se integran en el ámbito de trabajo del CPC existente en Jit y en el de nueva creación en Jinsafut, mes 12.
- Las preocupaciones relacionadas con la protección de la infancia son identificadas, monitoreadas, reportadas y referidas por los CPC en Jit y Jinsafut, mes 12.
- Apoyados 24 alumnas y 24 alumnos que presenten síntomas de angustia psicosocial, mediante 40 sesiones de terapia de grupo aplicando el enfoque de Terapia Cognitivo-Conductual, en 4 colegios públicos en Jit y Jinsafut, mes 12.
- Apoyado el profesorado (20 mujeres, 20 hombres) de 4 colegios públicos en Jit y Jinsafut en el desarrollo de sus conocimientos y habilidades en el trato con alumnos/as que presenten síntomas de estrés psicosocial, mes 12.
- Apoyados 29 madres y 31 padres en el desarrollo de sus conocimientos y habilidades en el trato con menores que presenten síntomas de angustia psicosocial a raíz de rupturas en el Ambiente Protector, en 4 colegios públicos en Jit y Jinsafut, mes 12.

R4: Fomentada la protección de 2816 adultos, con especial énfasis sobre 1380 mujeres, ante violaciones sistemáticas de sus derechos, Jit y Jinsafut, Qalqiliya, mes 12.

- Realizadas 32 horas de capacitación sobre CEDAW, y la violencia sexual y de género, en Jit y Jinsafut, mes 12.
- 50 miembros (25 mujeres, 25 hombres) de los CPC cuentan con una mejor comprensión de los marcos, instrumentos y mecanismos de protección de los derechos de la mujer, y de la lucha contra la violencia sexual y de género, en Jit y Jinsafut, mes 12.
- Las amenazas relacionadas con la protección relativas a los derechos, la seguridad y el bienestar de las mujeres y las niñas se integran en el ámbito de trabajo del CPC existente en Jit y en el de nueva creación en Jinsafut, mes 12.
- 72 mujeres y 24 hombres supervivientes de violencia de género y/u otros traumas reciben servicios especializados de apoyo psicosocial, en función de sus diferentes vulnerabilidades y necesidades basadas en el género, en Jit y Jinsafut, mes 12.
- Apoyadas 72 mujeres supervivientes de violencia de género y/u otros traumas con servicios psicosociales grupales, Jit y Jinsafut, mes 12.
- Mujeres supervivientes de violencia de género y/u otros traumas apoyadas demuestran mejores capacidades para afrontar al estrés psicosocial, Jit y Jinsafut, mes 12.
- Apoyados 24 hombres ex detenidos por las fuerzas militares y/u con otros traumas con servicios psicosociales grupales, Jit y Jinsafut, mes 12.
- Hombres ex detenidos por las fuerzas militares apoyados demuestran mejores capacidades para afrontar el trauma relacionado con su experiencia en prisión, Jit y Jinsafut, mes 12.

R5: 100.000 titulares de responsabilidades son conscientes de los factores estructurales que provocan violaciones de DIH/DIDH en la Zona C como paso en un proceso de influencia en los titulares de obligaciones para la transformación de las políticas y prácticas que permiten dichas violaciones, mes 12.

- Estudios basados en cartografía e imágenes aéreas realizados por Peace Now permiten el monitoreo de la expansión de asentamientos y puestos de avanzada israelíes en Cisjordania, con un enfoque específico sobre la región de Qalqiliya, mes 12.
- 100.000 personas, jóvenes y adultos jóvenes israelíes, cuentan con mayor conocimiento sobre los asentamientos y los puestos de avanzada israelíes como causa estructural de violaciones de los derechos de la población palestina en Zona C, mes 12.



- Facilitado el acceso de la justicia a 1-3 víctimas palestinas de violaciones del DIH/DIH dentro del sistema legal israelí, mes 12.
- Registrada información actualizada sobre violaciones de DIH/DIDH cometidas contra la población palestina por civiles/militares israelíes en Cisjordania, mes 12.

Actividades

A1.R1:	Creación de un mecanismo de rendición de cuentas para la presentación de reclamaciones por parte de la población destinataria, en Jit y Jinsafut, mes 2.
A2.R1:	Rehabilitación de 20 HA de tierras agrícolas de propiedad privada palestina, sin cultivar y en riesgo de confiscación, en Jit (10 HA) y Jinsafut (10 HA), meses 3-7
A3.R1:	Montaje de un vallado protector en 15 HA de propiedad privada palestina en riesgo de confiscación y bajo amenazas humanas y/o naturales en Jit (15 HA) y Jinsafut (5 HA), meses 8-9.
A4.R1:	Suministro de insumos agrícolas y plantación de 20 HA de tierras agrícolas en riesgo de confiscación, en Jit (10 HA) y Jinsafut (10 HA), meses 8-10.
A5.R1:	Construcción y rehabilitación de 2500 m2 de muros de contención de piedra, en Jit y Jinsafut, meses 3-8.
A6.R1:	Creación de empleo a corto plazo, en Jit y Jinsafut, meses 3-10.
A7.R1:	Realización de formaciones en mejores técnicas agrícolas y agricultura ecológica, y la gestión de recursos hídricos y prácticas de riego eficientes, en Jit y Jinsafut, meses 6-7.
A1.R2:	Realización de talleres participativos para la incorporación de un enfoque de RRD, género, discapacidad e protección de la infancia en el Plan de Respuesta Comunitaria ya existente en Jit, meses 2-3.
A2.R2:	Realización de talleres participativos para la elaboración de un Plan de Protección y Respuesta Comunitaria con un enfoque de RRD, género, discapacidad e protección de la infancia, que incluya actividades relacionadas, en Jinsafut, meses 2-3
A3.R2:	Celebración de dos talleres centrales en Jit (1) y Jinsafut (1) para identificar colectivamente los riesgos y prioridades que deben incluirse en los Planes de Protección y Respuesta Comunitaria, e identificación de los integrantes de los CPC, mes 4
A4.R2:	Elaboración, impresión y distribución de los Planes de Protección y RRD comunitarios en Jit y Jinsafut, mes 5
A5.R2:	Creación/ampliación de 2 Comités de Protección Comunitario (CPC), en Jit y Jinsafut, mes 4
A6.R2:	Realización de un cuestionario antes y después de la acción con los CPC en Jit y Jinsafut sobre sus percepciones sobre el nivel de preparación de las comunidades frente a violaciones de DIH/DIDH y desastres, mes 4
A7.R2:	Realización de formaciones para el CPC de nueva creación en Jinsafut sobre protección, el papel del defensor de los DDHH y la aplicación del DIH y DIDH, meses 4-7
A8.R2:	Realización de formaciones para el CPC de nueva creación en Jinsafut sobre habilidades para documentar y reportar violaciones de DIH y DIDH, meses 4-7



A9.R2:	Realización de formaciones para el CPC de nueva creación en Jinsafut sobre lobbying, incidencia y comunicación - estrategias, campañas y mensajes y actores claves, meses 4-7
A10.R2:	Realización de formaciones para los CPC en Jit y Jinsafut sobre los derechos de las personas con discapacidad y/o otras vulnerabilidades especiales, meses 4-7
A11.R2:	Realización de formaciones para los CPC sobre la Reducción de Riesgos ante Desastres, en Jit y Jinsafut, meses 4-7
A12.R2:	Realización de formaciones para los CPC sobre la extinción de incendios y seguridad, en Jit y Jinsafut, meses 4-7
A13.R2:	Realización de formaciones para los CPC sobre soporte vital básico, en Jit y Jinsafut, meses 4-7
A14.R2:	Distribución de los kits de soporte vital básico y protección a los CPC, en Jit y Jinsafut, mes 8
A15.R2:	Realización de 4 visitas de intercambio con otros CPC en localidades del entorno, en Jit y Jinsafut, meses 9-12
A16.R2:	Implementación de 2 iniciativas de protección y RRD comunitaria identificados vía los Planes de Protección y Respuesta Comunitaria, en Jit and Jinsafut, meses 9-12
A17.R2:	Diseño/actualización del formato de informe para documentar e informar sobre violaciones de DIH/DIDH, meses 4-7
A18.R2:	Documentación y difusión por los CPC de los casos de violaciones de DIH/DIDH producidos en Jit y Jinsafut, meses 7-12
A19.R2:	Implicación de un/a voluntario/a andaluz/a en el trabajo de los CPC, meses 9-11
A1.R3:	Realización de formaciones para los CPC sobre la protección infantil y los derechos de los niños y niñas, en Jit y Jinsafut, meses 4-7
A2.R3:	Realización de 2 talleres participativos para la incorporación de un enfoque de protección de la infancia, y que incluya actividades relacionadas, en los Planes de Protección y RRD comunitarios en Jit y Jinsafut, meses 2-3
A3.R3:	Celebración de dos talleres centrales en Jit (1) y Jinsafut (1) para identificar colectivamente los riesgos y prioridades que deben incluirse en los Planes de Protección y RRD comunitarios, con enfoque de protección de la infancia, mes 4
A4.R3:	Diseño/actualización del formato de informe para documentar e informar sobre violaciones de DIH/DIDH, con enfoque de protección de infancia, en Jit y Jinsafut, mes 4-7
A5.R3:	Documentación y difusión por los CPC de los casos de violaciones de DIH/DIDH producidos en Jit y Jinsafut, incluidas las que se producen contra menores, meses 4-12
A6.R3:	Realización de sesiones de terapia en grupo para alumnos/as que presenten síntomas de estrés psicosocial, en Jit y Jinsafut, meses 4-12
A7.R3:	Realización de talleres con el profesorado para desarrollar sus conocimientos y habilidades en el trato con alumnos/as que presenten síntomas de estrés psicosocial, en Jit y Jinsafut, meses 4-12
A8.R3:	Realización de reuniones con madres y padres de niños/s que presenten síntomas estrés psicosocial, en Jit y Jinsafut, meses 4-12



A1.R4:	Realización de formaciones para los CPC sobre el papel de la mujer en la resolución de conflictos y la construcción de la paz según la Resolución 1325 de la ONU, en Jit y Jinsafut, meses 4-7
A2.R4:	Realización de formaciones para los CPC sobre CEDAW, y la violencia sexual y de género, en Jit y Jinsafut, meses 4-7
A3.R4:	Realización de 2 talleres participativos para la incorporación de la perspectiva de mujeres, y que incluya actividades relacionadas, en los Planes de Protección y Respuesta Comunitarias en Jit y Jinsafut, meses 2-3
A4.R4:	Celebración de dos talleres centrales en Jit (1) y Jinsafut (1) para identificar colectivamente los riesgos y prioridades que deben incluirse en los Planes de Protección y Respuesta Comunitaria, desde la perspectiva de mujeres, mes 4
A5.R4:	Diseño/actualización del formato de informe para documentar e informar sobre violaciones de DIH/DIDH, con enfoque de género, en Jit y Jinsafut, meses 4-7
A6.R4:	Documentación y difusión por los CPC de los casos de violaciones de DIH/DIDH producidos en Jit y Jinsafut, incluidas las que se producen contra mujeres, meses 4-12
A7.R4:	Realización de sesiones de terapia en grupo para mujeres víctimas de violencia de género y/o que presentan síntomas estrés psicosocial, en Jit y Jinsafut, meses 4-12
A8.R4:	Realización de sesiones de terapia en grupo para hombres ex detenidos por las fuerzas militares y/o que presentan síntomas de estrés psicosocial, en Jit y Jinsafut, meses 4-12
A1.R5:	Monitoreo y actualización por Peace Now de datos sobre los asentamientos y puestos de avanzada israelíes como violación del DIH/DIDH, meses 1-12
A2.R5:	Realización de una campaña de incidencia social por Peace Now dirigido a titulares de responsabilidades, meses 2-12
A3.R5:	Registro de testimonios de víctimas afectadas por delitos contra la propiedad, delitos violentos, confiscación de tierras o daños ambientales cometidos por colonos/militares israelíes, meses 2-12
A4.R5:	Registro de los casos por tipo de incidente y ubicación geográfica, y con datos desglosados por género, meses 2-12
A5.R5:	Uso de datos de los casos registrados para informar a las actividades de incidencia de Yesh Din, meses 2-12

Annex 2d: AEXCID 2018 project sheet

INSTITUCIÓN Y AÑO DE CONVOCATORIA:	Agencia Extremeña De Cooperación Internacional Para el Desarrollo (AEXCID) 2018
ENTIDAD BENEFICIARIA:	Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP)
ENTIDAD LOCAL SOCIA:	Agricultural Development Association (PARC) Palestinian Hydrology Group (PHG) Psycho-Social Counseling Center for Women (PSCCW)
TÍTULO DE LA INTERVENCIÓN:	Protección de los derechos y la dignidad de la población palestina bajo ocupación conforme al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Derecho Internacional de Derechos Humanos (DIDH), con especial énfasis en la lucha contra la violencia de género, la protección de la infancia y el RRD (Reducción de Riesgos de Desastres)
LOCALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN:	Deir Ballout, Bruqin, Salfit, Cisjordania, Palestina
SUBVENCIÓN OTORGADA:	425.000,00 €
COSTE TOTAL:	531.333,10 €
FECHA DE INICIO:	09/01/2019
FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN:	08/05/2021
PERIODO A EVALUAR:	09/01/2019-08/05/2021

Objetivos, resultados e indicadores esperados

OG: Contribuir a la protección de los derechos y la dignidad de la población palestina bajo ocupación conforme al DIH y el DIDH, con especial énfasis en la lucha contra la violencia de género, la protección de la infancia y el RRD
OE: Prevenir y mitigar el impacto de riesgos humanitarios y las crisis asociadas con violaciones de DIH/DIDH sobre los derechos y la dignidad de 7.803 personas (3.816 mujeres/niñas, 3.987 hombres/niños), Zona C, Salfit, Cisjordania, Palestina.
<p>11.OE Reforzada la resiliencia de 135 familias vulnerables (327 mujeres/niñas, 348 hombres/niños) frente a amenazas a sus medios de vida, dignidad y derechos de propiedad, y los impactos humanitarios de las mismas, Zona C, Deir Ballut y Bruqin, mes 24</p> <p>12.OE Mejorado el acceso al agua para consumo humano y la salubridad de las tierras, aguas subterráneas y aire de 7.803 personas (3.816 mujeres/niñas, 3.987 hombres/niños), Deir Ballut y Bruqin, mes 24</p> <p>13.OE Potenciada la capacidad de respuesta de 3.877 personas (1.910 mujeres/niñas, 1.967 hombres/niños) vulnerables a violaciones de DIH/DIDH para reivindicar sus derechos ante violaciones y desastres en Deir Ballut, mes 24.</p> <p>14.OE Fomentada la protección de los derechos de 2.040 niñas y 2.130 niños vulnerables a violaciones de DIH/DIDH conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño, Zona C, Deir Ballut y Bruqin, mes 24</p> <p>15.OE Impulsada la protección de los derechos de 1.778 mujeres, y 1.857 hombres vulnerables ante distintos tipos de violencia en función del género, Zona C, Deir Ballut y Bruqin, mes 24.</p> <p>16.OE Impulsado el proceso de transformación de políticas y prácticas por parte de los titulares de obligaciones que permiten continuadas violaciones de DIH/DIDH contra la población palestina bajo ocupación, mes 24.</p> <p>17.OE Promovida la participación activa de la sociedad civil extremeña en la resolución justa y duradera del conflicto árabe israelí, con especial atención a la contribución de la mujer y la juventud como motores del cambio político</p>
R1: Restablecidas y potenciadas las capacidades productivas de 135 hogares vulnerables (675 personas: 327 mujeres y niñas, 348 hombres y niños) cuyos medios de vida están amenazados, Zona C, Deir Ballut y Bruqin, Salfit, mes 24



- I1.R1 Creado un mecanismo de rendición de cuentas para presentación de reclamaciones por parte de la población destinataria de las actividades relacionadas con los medios de vida, de acuerdo con la Norma Esencial Humanitaria nº 5, Deir Ballut y Bruqin, mes 2
- I2.R1 Recuperados los medios de vida de 33 familias (80 mujeres/niñas, 85 hombres/niños) que dependen de tierras agrícolas vulnerables a la confiscación en Zona C, Deir Ballut, mes 24
- I3.R1 Mejorado el acceso a tierras agrícolas en Zona C de 75 familias agricultoras (375 personas: 182 mujeres y niñas, 193 hombres y niños), Bruqin, mes 24
- I4.R1 Protegido el cultivo de 27 familias agricultoras (135 personas: 65 mujeres y niñas, 70 hombres y niños) sobre 8 HA de tierras agrícolas en Zona C, de amenazas humanas y/o naturales, Deir Ballut, mes 24
- I5.R1 Generados 14.175 euros de ingresos para aproximadamente 51 familias vulnerables (124 mujeres y niñas, 131 hombres y niños) en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en el acceso a trabajo por dinero, Deir Ballut y Bruqin, mes 24
- I6.R1 Facilitado el acceso de 75 mujeres agricultoras a las tierras agrícolas de las que dependen sus medios de vida en Zona C, en condiciones de seguridad, Bruqin, mes 24
- I7.R1 15 mujeres y 15 hombres tienen igualdad de acceso a formación sobre mejores técnicas agrícolas, la agricultura ecológica, la gestión de los recursos hídricos y las prácticas eficaces de riego, Deir Ballut y Bruqin, mes 24

R2: Reducidas la falta de acceso al agua, la contaminación de las tierras y los acuíferos entorno a las comunidades de Deir Ballut y Bruqin y su incidencia sobre la salud de sus 7.803 habitantes (3.816 mujeres/niñas, 3.987 hombres/niños), mes 24

- I1.R2 Mejorada la protección de la salud de las 17 familias (41 mujeres y niñas, 44 hombres y niños) que viven en torno a los torrentes de aguas residuales de Bruqin provenientes de asentamientos de colonos, mes 24
- I2.R2 Mitigado el riesgo de contaminación de los medios de vida agropecuarios de 70 familias (169 mujeres y niñas, 181 hombres y niños) con tierras agrícolas y/o ganado entorno a los torrentes de aguas residuales en Bruqin, mes 24
- I3.R2 Disminuidas las amenazas de polución de los recursos hídricos subterráneos que alimentan pozos y manantiales de la población de Deir Ballut, mes 24
- I4.R2 Resueltas las preocupaciones de 25 mujeres por la insalubridad en el entorno del hogar en las cercanías de los torrentes de aguas residuales en Bruqin, mes 24
- I5.R2 Mejorado el acceso al agua para consumo humano de la población de 7.803 personas de Deir Ballut y Bruqin (3.816 mujeres/niñas, 3.987 hombres/niños) con el aumento de la capacidad de almacenamiento y suministro hídrico, mes 24
- I6.R2 Reducidos los riesgos para la salud de 19 niñas y 20 niños que habitan en las inmediaciones de los torrentes de aguas residuales en Bruqin por contaminación y recurrentes cortes en el suministro de agua; mes 24
- I7.R2 Generados 3.725 euros de ingresos para aproximadamente 8 familias vulnerables (19 mujeres y niñas, 21 hombres y niños) mediante oportunidades de trabajo por dinero, Deir Ballut y Bruqin, mes 24

R3: Mejorado el posicionamiento de 25 personas (13 mujeres, 12 hombres) para hacer frente a riesgos que afectan al cumplimiento de los derechos de 3.877 personas vulnerables a violaciones de DIH/DIDH y desastres, Deir Ballut, Salfit, mes 24

- I1.R3 Elaborado de forma participativa e igualitaria 1 Plan de Protección y RRD comunitario por el Comité de Protección Comunitaria (CPC), y diseminados los mismos en Deir Ballut, mes 24
- I2.R3 Creado un Comité de Protección Comunitario (CPC) en Deir Ballut para la Reducción del Riesgo de Desastres naturales y humanos, y para monitorear, documentar y reportar sobre violaciones de DIH/DIDH, mes 24
- I3.R3 Fomentada la participación de mujeres en el CPC de Deir Ballut y la inclusión en su labor en la consecución de objetivos de género basados en el análisis de los diferentes riesgos y capacidad de respuesta de mujeres y hombres, mes 24



14.R3 Capacitados 13 mujeres y 12 hombres integrante del CPC en Deir Ballut en un extenso programa de formación diseñado para fomentar la resiliencia, el empoderamiento y la movilización de la comunidad ante violaciones de DIH/DIDH, mes 24

15.R3 Integrado un componente específico sobre los derechos de las personas con diversidad funcional y/o con otras vulnerabilidades especiales en la formación de las 25 personas integrantes del CPC en Deir Ballut, mes 24.

16.R3 Impulsado el reconocimiento entre la población del CPC de Deir Ballut como organización de la sociedad civil en la prevención y respuesta ante desastres y violaciones, y fortalecidas sus enlaces con otros CPCs, mes 24

17.R3 Identificados y abordados riesgos que suponen una amenaza para la seguridad y el bienestar de 3.877 personas (1.910 mujeres y niñas, 1.967 hombres y niños), y para la protección medioambiental en Deir Ballut, mes 24

18.R3 Diseñado un sistema para informar sobre los incidentes de violaciones de DIH/DIDH que se producen en Deir Ballut por el que el 80% de los incidentes documentados por el CPC son denunciados y/o remitidos a terceros para apoyo adicional, mes 24

R4: Fomentada la protección de 2.040 niñas y 2.130 niños ante violaciones sistemáticas de sus derechos, Deir Ballut y Bruqin, mes 24

11.R4 Capacitados 25 integrantes (13 mujeres, 12 hombres) del CPC de Deir Ballut sobre la Convención sobre los Derechos del Niño, y principales instrumentos del Derecho Internacional y sistemas nacionales de protección de la infancia, mes 24

12.R4 Integrados los mecanismos internacionales y nacionales de protección infantil en el trabajo de identificación, monitoreo y denuncia desarrollado por los 25 miembros (13 mujeres, 12 hombres) de los CPC de Deir Ballut, mes 24

13.R4 Apoyados 30 alumnas y 30 alumnos que presenten síntomas de angustia psicosocial, mediante 40 sesiones de terapia de grupo aplicando el enfoque de Terapia Cognitivo-Conductual, en 4 colegios públicos en Deir Ballut y Bruqin, mes 24.

14.R4 Asistido el profesorado (20 mujeres, 20 hombres) de 4 colegios públicos en Deir Ballut y Bruqin en el desarrollo de sus conocimientos y habilidades en el trato con alumnos/as que presenten síntomas de estrés psicosocial, mes 24

15.R4 Apoyados 29 madres y 31 padres en el desarrollo de sus conocimientos y habilidades en el trato con menores que presenten síntomas de angustia psicosocial a raíz de rupturas en el Ambiente Protector, en 4 colegios públicos en Deir Ballut y Bruqin, mes 24

R5: Fomentada la protección de 3.785 adultos, con especial énfasis sobre 1.778 mujeres, ante violaciones sistemáticas de sus derechos, Deir Ballut y Bruqin, Salfit, mes 24

11.R5 Capacitados los 25 integrantes (13 mujeres, 12 hombres) del CPC de Deir Ballut sobre CEDAW, y la violencia sexual y de género, mes 24

12.R5 Integrados los mecanismos de protección de los derechos de la mujer y de lucha contra la violencia sexual y de género en el trabajo de identificación y respuesta de los 25 miembros (13 mujeres, 12 hombres) del CPC de Deir Ballut, mes 24

13.R5 Apoyadas 40 mujeres y 20 hombres supervivientes de violencia de género y/u otros traumas mediante servicios de apoyo psicosocial, en función de sus diferentes vulnerabilidades y necesidades basadas en el género, en Deir Ballut y Bruqin, mes 24

14.R5 40 mujeres supervivientes de violencia de género y/u otros traumas apoyadas con terapias grupales muestran mejores capacidades para afrontar el estrés psicosocial, Deir Ballut y Bruqin, mes 24

15.R5 20 hombres ex detenidos por las fuerzas militares y/o con otros traumas apoyados con terapias grupales muestran mejores capacidades para afrontar el trauma relacionada con su experiencia en prisión, Deir Ballut y Bruqin, mes 24

R6: Impulsada la concienciación de los titulares de responsabilidades sobre las dimensiones políticas, sociales y culturales de las causas estructurales de violaciones de DIH/DIDH, como parte del proceso de influencia en los titulares de obligaciones para la transformación de las políticas que lo fomentan; mes 24



11.R6	Estudios basados en cartografía e imágenes aéreas realizados por Peace Now permiten el monitoreo de la expansión de asentamientos y puestos de avanzada israelíes en Cisjordania, con un enfoque específico sobre la región de Salfit, mes 18
12.R6	103.000 personas, principalmente adultos jóvenes israelíes, cuentan con mayor conocimiento sobre los asentamientos y los puestos de avanzada israelíes como causa estructural de violaciones de los derechos de la población palestina en Zona C, mes 18
13.R6	Se fomenta la información y sensibilización de entre 15 y 20 titulares de responsabilidad israelíes sobre las consecuencias de la expansión de asentamientos en la violación sistemática de los DIH/DIDH de la población palestina; mes 24
14.R6	Facilitado el acceso de la justicia a 6-12 víctimas palestinas de violaciones del DIH/DIH dentro del sistema legal israelí, mes 24.
15.R6	Registrada información actualizada sobre violaciones de DIH/DIDH cometidas contra la población palestina por civiles/militares israelíes en Cisjordania, mes 24
16.R6	Mejorados los conocimientos y las capacidades de 10-20 mujeres palestinas sobre cómo acceder a la justicia en caso de violaciones de derechos humanos; mes 24.
17.R6	Recopilados y registrados los planes, órdenes y amenazas sobre las tierras vulnerables que ponen en riesgo los medios de vida de la población de Deir Ballut y Bruqin (Salfit); mes 24
18.R6	Los 9.450 titulares de derechos (4.653 mujeres y niñas, 4.797 hombres y niños) Deir Ballut y Bruqin (Salfit), cuentan con mapas detallados de las tierras más vulnerables ante el riesgo de confiscación como paso inicial para establecer medidas efectivas; mes 24

Actividades

A1.R1:	Creación de un mecanismo de rendición de cuentas para la presentación de reclamaciones por parte de la población destinataria, en Deir Ballut y Bruqin, mes 2
A2.R1:	Rehabilitación y plantación de 15 HA de tierras agrícolas de propiedad privada palestina, sin cultivar y en riesgo de confiscación y montaje de un vallado protector en 8 HA bajo amenazas humanas y/o naturales, en Deir Ballut, meses 4-14
A3.R1:	Apertura de 1,5 Km de caminos agrícolas, incluido el acondicionamiento de las cunetas en sus laterales, en Bruqin, meses 4-14
A4.R1:	Realización de formaciones en mejores técnicas agrícolas y agricultura ecológica, y la gestión de recursos hídricos y prácticas de riego eficientes, en Deir Ballut y Bruqin, meses 10-11
A5.R1:	Creación de oportunidades de trabajo por dinero en el sector agrícola, en Deir Ballut y Bruqin, meses 4-14
A1.R2:	Encauzamiento y cubrición de 100 metros lineales de torrente de aguas residuales en Bruqin (100m), meses 3-8
A2.R2	Construcción e instalación de 7 plantas domésticas de tratamiento de aguas grises en Deir Ballut, meses 8-15
A3.R2:	Extensión del sistema de abastecimiento de agua de Deir Ballut y Bruqin con la instalación de 1000 ml de una tubería de suministro de agua en Bruqin y 1000 ml de una tubería de suministro de agua en Deir Ballut, meses 3-8
A4.R2:	Creación de oportunidades de trabajo por dinero en el sector de agua y saneamiento, en Deir Ballut y Bruqin, meses 3-8



A1.R3:	Realización de talleres participativos para la incorporación de un enfoque de RRD, género, discapacidad y protección de la infancia, en el Plan de Protección y RRD comunitario a elaborar en Deir Ballut, meses 3-5
A2.R3:	Celebración de un taller central en Deir Ballut para identificar colectivamente los riesgos y prioridades que deben incluirse en los Planes de Protección y RRD comunitarios, identificación de los integrantes de los CPC y elaboración, impresión y distribución del Plan de Protección y RRD comunitario en Deir Ballut, mes 6-10
A3.R3:	Creación de 1 Comité de Protección Comunitario (CPC) en Deir Ballut, mes 7-9
A4.R3:	Realización de 3 formaciones para el nuevo CPC en Deir Ballut sobre: Protección, el papel del defensor de DDHH y la aplicación del DIH y DIDH; Habilidades para documentar y reportar violaciones de DIH y DIDH; Lobbying, incidencia y comunicación, meses 11-17
A5.R3:	Realización de formaciones para el CPC de Deir Ballut sobre los derechos de las personas con diversidad funcional y/o otras vulnerabilidades especiales, y el soporte vital básico, meses 11-17
A6.R3:	Realización de formaciones para el CPC sobre la Reducción de Riesgos ante Desastres, y la extinción de incendios y seguridad, y distribución de kits de soporte vital básico y de seguridad al CPC, en Deir Ballut, meses 11-17
A7.R3:	Realización de 2 visitas de intercambio con otros CPC en localidades del entorno, en Deir Ballut, meses 17-24
A8.R3:	Implementación de 1 iniciativa de protección y RRD comunitaria identificados vía los Planes de Protección y Respuesta Comunitaria, en Deir Ballut, meses 17-24
A9.R3:	Documentación y difusión por el CPC de los casos de violaciones de DIH/DIDH producidos en Deir Ballut sobre la base de un diseño/actualización de formato de informe, con especial énfasis en los producidos sobre mujeres y menores, meses 17-24
A1.R4:	Realización de 1 taller participativo para la incorporación de un enfoque de protección de la infancia que incluya actividades relacionadas, e inclusión de los riesgos y prioridades que afectan a la infancia en el taller central y en el Plan de Protección y RRD comunitario, en Deir Ballut, meses 3-5
A2.R4:	Realización de formaciones para el CPC sobre la protección infantil y los derechos de los niños y niñas y documentación y difusión por el CPC de los casos de violaciones de DIH/DIDH contra menores producidos en Deir Ballut, meses 10-24
A3.R4:	Realización de sesiones de terapia en grupo para alumnos/as que presenten síntomas de estrés psicosocial, en Deir Ballut y Bruqin, meses 3-24
A4.R4:	Realización de sesiones con el profesorado para desarrollar sus conocimientos y habilidades en el trato con alumnos/as que presenten síntomas de estrés psicosocial, en Deir Ballut y Bruqin, meses 3-24
A5.R4:	Realización de reuniones con madres y padres de niños/s que presenten síntomas estrés psicosocial, en Deir Ballut y Bruqin, meses 3-24

A1.R5:	Realización de 1 taller participativo para la incorporación de la perspectiva de género que incluya actividades relacionadas, e inclusión de los riesgos y prioridades desde la perspectiva de las mujeres en el taller central y en el Plan de protección RRD comunitario, en Deir Ballut, meses 3-8
A2.R5:	Realización de formaciones para el CPC sobre el papel de la mujer en la resolución de conflictos y la construcción de la paz y CEDAW, y sobre violencia sexual y de género; y documentación y difusión por el CPC de los casos de violaciones de DIH/DIDH contra mujeres producidos en Deir Ballut, meses 11-24
A3.R5:	Realización de sesiones de terapia en grupo para mujeres víctimas de violencia de género y/o que presentan síntomas estrés psicosocial, en Deir Ballut y Bruqin, meses 3-24
A4.R5:	Realización de sesiones de terapia en grupo para hombres ex detenidos por las fuerzas militares y/o que presentan síntomas de estrés psicosocial, en Deir Ballut y Bruqin, meses 3-24
A1.R6:	Monitoreo y actualización de datos sobre los asentamientos y puestos de avanzada israelíes como causa estructural de violación del DIH/DIDH, meses 7-24
A2.R6:	Realización de una campaña de incidencia social en redes y de información dirigida a la población joven israelí sobre la expansión de asentamientos, vulneración de DDHH y herramientas para abogar por un cambio social, compuesta por ponencias, charlas y tours por Cisjordania, centradas en el área de Salfit, meses 8-24
A3.R6:	Registro de testimonios de víctimas afectadas por delitos contra la propiedad, delitos violentos, confiscación de tierras o daños ambientales cometidos por colonos/militares israelíes, meses 2-24
A4.R6:	Registro por medios de Sistemas de Información Geográfica (SIG) de los casos por tipo de incidente y ubicación geográfica, y con datos desglosados por género y uso de datos de los casos registrados para informar en las actividades de incidencia de Yesh Din, meses 2-24
A5.R6:	Realización de 1 taller para mujeres sobre el acceso de las mujeres a la justicia durante el período del proyecto, meses 8-9
A6.R6:	A12.R6. Recogida de información con referencia al estado de la tierra, planes previstos y ordenes expedidas en la zona de Salfit, meses 2-4
A7.R6:	A13.R6. Mapeo de las tierras vulnerables por riesgo de confiscación ante el acaparamiento de terrenos por parte de las autoridades israelíes, meses 4-7
A1.R7:	Reuniones de presentación del proyecto y selección de 5 jóvenes políticos/as extremeños/as que participarán en las experiencias de cooperación entre la sociedad civil y policía extremeña y palestina e israelí. Constitución de grupo estable de trabajo; meses 3-6
A2.R7:	Misión de un grupo de 5 jóvenes líderes/sas políticos/as de Extremadura a Palestina e Israel; mes 10
A3.R7:	Elaboración de una ponencia política sobre el rol de Europa, España y Extremadura en la resolución del conflicto palestino-israelí; meses 11-14
A4.R7:	Sesiones de devolución de la experiencia adquirida en el seno de cada organización participante; meses 15-16
A5.R7:	Visita conjunta de una organización israelí y una organización palestina a Extremadura



A6.R7:	Seminario sobre resolución de conflictos y el papel activo de la mujer y la juventud
---------------	--

Annex 2e: AACID 2016 project sheet

INSTITUCIÓN Y AÑO DE CONVOCATORIA:	Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) 2016
ENTIDAD BENEFICIARIA:	Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP)
ENTIDAD LOCAL SOCIA:	Agricultural Development Association (PARC) Psycho-Social Counseling Center for Women (PSCCW)
TÍTULO DE LA INTERVENCIÓN:	Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia
LOCALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN:	Halhoul, Deir Al Asal, Hebrón, Cisjordania, Palestina
SUBVENCIÓN OTORGADA:	300.000,00
COSTE TOTAL:	330.000,00
FECHA DE INICIO:	19/01/2020
FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN:	18/05/2021
PERIODO A EVALUAR:	19/01/2020-18/05/2021

Objetivos, resultados e indicadores esperados

OG: Contribuir a la protección de los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género e infancia.
OE: Prevenir y mitigar el impacto de riesgos humanitarios y las crisis asociadas con violaciones de DIH/DIDH sobre los derechos de 32.065 personas (16.267 mujeres y niñas, 15.798 hombres y niños) , Halhoul y Deir al Asal, Hebrón, Cisjordania, Palestina.
I1.OE: 131 familias palestinas vulnerables (405 mujeres y niñas, 394 hombres y niños) son más capaces de hacer frente a amenazas a sus medios de vida y su dignidad, y los impactos humanitarios de las mismas, Zona C, Halhoul y Deir al Asal, Hebrón.
I2.OE: 856 menores vulnerables (283 niñas, 573 niños) son capaces de acceder a servicios esenciales para realizar su derecho a la educación de una manera segura y digna, Halhoul y Deir al Asal, Hebrón, Cisjordania, Palestina.
I3.OE 32,065 personas (16,267 mujeres y niñas, 15,798 hombres y niños) vulnerables a violaciones de DIH y DIDH están mejor posicionados para garantizar la protección de sus derechos ante violaciones y desastres, Zona C, Halhoul y Deir al Asal, Hebrón, Cisjordania, Palestina.
I5.OE: Evidenciadas a 93.000 personas las causas estructurales de violaciones de DIH y DIDH contra la población palestina, y el papel y el deber de los diferentes titulares de obligaciones en este sentido, mes 12.
I6.OE: Apoyada la resiliencia y capacidades de respuesta de 405 personas (246 mujeres y niñas, 159 hombres y niños) víctimas y familiares de víctimas de violencia y/o violaciones de DIH y DIDH, Halhoul y Deir al Asal, Hebrón, Cisjordania, Palestina.
R1: Fomentada la resiliencia y protegidos los medios de vida agrícolas de 131 familias vulnerables (799 personas: 405 mujeres y niñas, 394 hombres y niños) , Zona C, Halhoul y Deir al Asal, Hebrón, Cisjordania, Palestina, mes 12.
I1.R1: Mejorado el acceso a tierras agrícolas en Zona C de 90 familias agricultoras (549 personas: 279 mujeres y niñas, 270 hombres y niños) en Deir al Asal, mes 12.
I2.R1: Reducidos 30 minutos de media el tiempo necesario por parte de 90 mujeres agricultoras en acceder a sus tierras agrícolas en Zona C, Deir al Asal, mes 12.
I3.R1: Facilitada la recuperación de 70 dunums de tierras agrícolas en Zona C sobre los que dependen los medios de vida de 32 familias (99 mujeres y niñas, 96 hombres y niños) en Halhoul y Deir al Asal, mes 12.
I4.R1: Mejorado el acceso al agua para uso agrícola en Zona C de 3 familias (18 personas: 10 mujeres y niñas, 8 hombres y niños) en Hal-houl, mes 12.

I5.R1: Generados 7.800 euros de ingresos para aproximadamente 25 familias vulnerables (153 personas: 78 mujeres y niñas, 75 hombres y niños) mediante la creación de empleo a corto plazo, al mes 12.

I6.R1: Fortalecidas las capacidades de 60 personas (30 mujeres y 30 hombres) en sistemas de agricultura orgánica, gestión de recursos hídricos y sistemas de regadío como forma para la recuperación de sus medios de vida, en Halhoul y Deir al Asal, mes 12.

I7.R1: Mejorada la protección medioambiental de 823 dunums de tierras agrícolas en Zona C sobre los que dependen los medios de vida de 131 familias palestinas vulnerables (405 mujeres y niñas, 394 hombres y niños), Halhoul y Deir al Asal, mes 12.

R2: Mejorado el acceso de 856 alumnos (283 niñas, 573 niños) a espacios seguros para la infancia para facilitar el cumplimiento de sus derechos a la educación y la protección, en 3 colegios públicos de Halhoul y Deir al Asal, Hebrón, mes 12.

I1.R2: Mejorado el acceso al agua potable mediante la rehabilitación de la red de acometida y el aumento de capacidad de almacenamiento de agua para 856 alumnos (283 niñas, 573 niños) en 3 colegios públicos en Halhoul y Deir al Asal, mes 12.

I2.R2: Habilitado 1 espacio de interacción y aprendizaje seguro y saludable para 167 alumnos (93 niñas, 74 niños) en 1 colegio público en Deir al Asal, mes 12.

I3.R2: Establecidas las condiciones de seguridad en el acceso y estancia en 1 colegio público para 167 alumnos (93 niñas, 74 niños) en Deir al Asal, mes 12.

I4.R2: Mejoradas las condiciones higiénico sanitarias de 429 alumnos (190 niñas, 239 niños) de 1 colegio público en Deir al Asal mediante la rehabilitación y ampliación de los bloques sanitarios, mes 12.

I5.R1: Generados 5.772 euros de ingresos para aproximadamente 18 familias vulnerables (110 personas: 56 mujeres y niñas, 54 hombres y niños) mediante la creación de empleo a corto plazo, al mes 12.

R3: Mejorado el posicionamiento de 45 personas (23 mujeres, 22 hombres) para hacer frente a riesgos que afectan al cumplimiento de los derechos de 32,065 personas vulnerables a violaciones de DIH/DIDH y desastres, Halhoul y Deir al Asal, Hebrón, mes 12.

I1.R3: Elaborado de modo participativo e implementado un plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres naturales y humanos por el Grupo de Protección Comunitaria en Halhoul, mes 12.

I2.R3: Creados y dotados 2 Grupos de Protección Comunitario (GPC) para la Reducción Riesgo de Desastres naturales y humanos, y para documentar y reportar violaciones del DIH/DIDH en las comunidades de Halhoul y Deir al Asal, mes 12.

I3.R3: Fomentada la igualdad de género entre mujeres y hombres integrantes de los GPC en Halhoul y Deir al Asal con la participación activa y mayoritaria de mujeres, mes 12.

I4.R3: Capacitadas 45 personas (23 mujeres, 22 hombres) integrantes de los GPC en Halhoul y Deir al Asal en el papel del defensor de los derechos humanos y la aplicación de DIH y DIDH, mes 12.

I5.R3: Capacitadas 45 personas (23 mujeres, 22 hombres) integrantes de los GPC en Halhoul y Deir al Asal en habilidades para documentar y reportar sobre violaciones de DIH y DIDH, mes 12.

I6.R3: Capacitadas 45 personas (23 mujeres, 22 hombres) integrantes de los GPC en Halhoul y Deir al Asal en lobbying, incidencia y comunicación - estrategias, campañas, y mensajes y actores claves, mes 12.

I7.R3: Capacitadas 45 personas (23 mujeres, 22 hombres) integrantes de los GPC en Halhoul y Deir al Asal en el papel de las mujeres en la resolución de conflictos y la construcción de paz de acuerdo con la resolución 1325 de la ONU, mes 12.

I8.R3: Capacitadas 45 personas (23 mujeres, 22 hombres) integrantes de los GPC en Halhoul y Deir al Asal en la prevención, reducción y mitigación de desastres, mes 12.

I9.R3: Capacitadas 45 personas (23 mujeres, 22 hombres) integrantes de los GPC en Halhoul y Deir al Asal en la extinción de incendios, soporte vital básico y seguridad, mes 12.

I10.R3: Abordados determinados riesgos que suponen una amenaza para la seguridad y el bienestar de 32,065 personas (16,267 mujeres y niñas, 15,798 hombres y niños), y para la protección medioambiental en Halhoul y Deir al Asal, mes 12.

I11.R3: Al menos un 60% de la población de Halhoul y Deir Al Asal encuestada valora de forma positiva la mejora de su capacidad para prevenir, reducir y mitigar desastres, mes 12.

R4: 93.000 personas acceden a información sobre la violación de derechos de la población palestina en Zona C, y el impacto humanitario que conllevan, con el fin de generar una mayor exigencia de rendición de cuentas de titulares de obligaciones, mes 12.

I1.R4: Documentados el 100% de los casos de violaciones de DIH y DIDH por los GPC en Halhoul y Deir al Asal, mes 12.

I2.R4: Recogidos los datos y actualizadas las estadísticas de Peace Now sobre los asentamientos y puestos de avanzada israelíes en el gobierno-rado de Hebrón, como causa estructural de violaciones de los derechos de la población palestina en Zona C, mes 12.

I3.R4: Realizada por Peace Now una campaña de difusión y educación sobre la conexión entre asentamientos y puestos de avanzada israelíes y violaciones de derechos de la población palestina, y el papel de titulares de obligaciones israelíes, mes 12.

I4.R4: Emitida por All for Peace Radio una campaña radiofónica de sensibilización sobre las violaciones de DIH y DIDH de y las problemáticas humanitarias a las que se enfrentan la población palestina de la Zona C, mes 12.

R5: Facilitado el acceso de 405 personas (246 mujeres y niñas, 159 hombres y niños) víctimas y familiares de víctimas de violencia y/o violaciones a servicios especializados de apoyo psicosocial, Halhoul y Deir al Asal, Hebrón, Cisjordania, Palestina, mes 12.

I1.R5: Apoyados 80 alumnos (41 niñas, 39 niños) que presenten síntomas de TEPT, a través de 72 sesiones de terapia de grupo aplicando el enfoque de Terapia Cognitivo-Conductual, en 4 colegios públicos en Halhoul y Deir al Asal, mes 12.

I2.R5: Apoyado el profesorado (41 mujeres, 39 hombres) de 4 colegios públicos en Halhoul y Deir al Asal en el desarrollo de sus conocimientos y habilidades en el trato con alumnos/as que presenten síntomas de TEPT, mes 12.

I3.R5: Apoyadas/os 61 madres y 59 padres en el desarrollo de sus conocimientos y habilidades en el trato con niños/s que presenten síntomas de TEPT a raíz de violencia domestica/de género, en 4 colegios públicos en Halhoul y Deir al Asal, mes 12.

I4.R5: Apoyadas 50 mujeres y niñas sobrevivientes de violencia de género con servicios psicosociales individuales, Halhoul y Deir al Asal, mes 12.

I5.R5: Empoderadas 30 mujeres víctimas de violencia de género con las herramientas y capacidades para hacer frente a su trauma, Halhoul y Deir al Asal, mes 12.

Actividades

Actividades
A1.R0. Firma de planes de trabajo entre ACPP y PARC, y ACPP y PSCCW
A2.R0. Constitución del Comité de Gestión del proyecto (mes 1)
A3.R0. Revisión de los criterios de selección y diseño de herramientas de seguimiento (mes 1)
A4.R0. Proceso de selección de la población destinataria concreta (meses 1-2)
A5.R0. Establecimiento de la línea de base del proyecto (meses 1-2)
A6.R0. Procedimiento de licitación para servicios, obras y suministros (meses 1-3)
A7.R0. Monitoreo, seguimiento y visibilidad (Meses 1-12)
A8.R0. Elaboración de la línea de base final (meses 11-12)
A9.R0. Evaluación y auditoria externa (mes 12+)
A1.R1. Rehabilitación de 3 km de carreteras agrícolas, en Deir al Asal (meses 4-12)
A2.R1. Construcción y rehabilitación de 1560 m2 de muros de contención de piedra, en Halhoul y Deir al Asal (meses 4-12)
A3.R1. Construcción de 3 cisternas agrícolas para el almacenamiento de agua de lluvia, en Halhoul (meses 4-12)
A4.R1. Creación de empleo a corto plazo, en Halhoul y Deir al Asal (meses 4-12)



Actividades
A5.R1. Realización de formaciones en sistemas de agricultura orgánica, gestión de recursos hídricos y sistemas de riego, en Halhoul y Deir al Asal (meses 6-7)
A1.R2. Rehabilitación del sistema de agua potable en 3 colegios públicos en Halhoul y Deir al Asal (meses 4-9)
A2.R2. Habilitación de un espacio de interacción y aprendizaje seguro y saludable en 1 colegio público, en Deir al Asal (meses 4-9)
A3.R2. Realización de obras de acondicionamiento para crear condiciones de seguridad en el acceso y estancia en 1 colegio público, en Deir al Asal (meses 4-9)
A4.R2. Rehabilitación de los bloques sanitarios en 1 colegio público, en Deir al Asal (meses 4-9)
A5.R2. Creación de empleo a corto plazo, en Halhoul y Deir al Asal (meses 4-9)
A1.R3. Realización de 10 talleres participativos sobre la prevención y respuesta para la reducción de desastres y de violaciones de DIH y DIDH, en Halhoul y Deir al Asal (meses 2-3)
A2.R3. Elaboración, impresión y distribución del Plan de prevención y mitigación de desastres para prevenir las posibles amenazas a las que se enfrenta las comunidades, en Halhoul y Deir al Asal (meses 3-4)
A3.R3. Creación de 2 Grupos de Protección Comunitario (GPC), en Halhoul y Deir al Asal (meses 4)
A4.R3. Realización de formaciones para los GPC sobre protección, el papel del defensor de los DDHH y la aplicación del DIH y DIDH, en Halhoul y Deir al Asal (meses 4-6)
A5.R3. Realización de formaciones para los GPC sobre habilidades para documentar y reportar sobre violaciones de DIH y DIDH, en Halhoul y Deir al Asal (meses 4-6)
A6.R3. Realización de formaciones para los GPC sobre lobbying, incidencia y comunicación - estrategias, campañas y mensajes y actores claves, en Halhoul y Deir al Asal (meses 4-6)
A7.R3. Realización de formaciones para los GPC sobre el papel de la mujer en la resolución de conflictos y la construcción de la paz según la Resolución 1325 de la ONU, en Halhoul y Deir al Asal (meses 4-6)
A8.R3. Realización de formaciones para los GPC sobre la Reducción de Riesgos ante Desastres, en Halhoul y Deir al Asal (meses 4-6)
A9.R3. Realización de formaciones para los GPC sobre la extinción de incendios, soporte vital básico y seguridad, en Halhoul y Deir al Asal (meses 4-6)
A10.R3. Distribución de los medios materiales para apoyar al Grupo de Protección Comunitario, en Halhoul y Deir al Asal (meses 6)
A11.R3. Realización de 4 visitas de intercambio con otros GPC en localidades del entorno, en Halhoul y Deir al Asal (meses 7-8)
A12.R3. Implementación de 2 iniciativas de protección comunitaria propuestas por la comunidad, en Halhoul y Deir al Asal (meses 7-12)
A13.R3. Publicación y difusión de los casos de violaciones de DIH y DIDH documentados por el grupo de protección, en Halhoul y Deir al Asal (meses 7-12)
A1.R4. Monitoreo y actualización por Peace Now de datos sobre los asentamientos y puestos de avanzada israelíes y de las violaciones cometidas por los habitantes de los mismos (meses 1-12)
A2.R4. Realización de una campaña de difusión por Peace Now dirigido a titulares de obligaciones y responsabilidades (meses 2-12)
A3.R4. Realización de una campaña radiofónica de testimonio por All for Peace Radio dirigido a titulares de deberes y responsabilidades (meses 1-12)
A1.R5. Realización de sesiones de terapia en grupo para alumnos/as que presenten síntomas de TEPT, en Halhoul y Deir al Asal (meses 2-12)



Actividades
A2.R5. Realización de talleres con el profesorado para desarrollar sus conocimientos y habilidades en el trato con alumnos/as que presenten síntomas de TEPT, en Halhoul y Deir al Asal (meses 3-11)
A3.R5. Realización de reuniones con madres y padres de niños/s que presenten síntomas de TEPT, en Halhoul y Deir al Asal (meses 4-12)
A4.R5. Realización de sesiones de asesoramiento psicológico individual para mujeres y niñas sobrevivientes de violencia de género, en Halhoul y Deir al Asal (meses 2-12)
A5.R5. Creación de 2 grupos de autoayuda para mujeres víctimas de violencia de género, en Halhoul y Deir al Asal (meses 2-12)

Annex 2f: AACID 2018 project sheet

INSTITUCIÓN Y AÑO DE CONVOCATORIA:	Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) 2018
ENTIDAD BENEFICIARIA:	Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP)
ENTIDAD LOCAL SOCIA:	Agricultural Development Association (PARC) Palestinian Hydrology Group (PHG) Psycho-Social Counseling Center for Women (PSCCW)
TÍTULO DE LA INTERVENCIÓN:	Protección de los derechos y la dignidad de la población palestina bajo ocupación conforme al DIH y el DIDH, con especial énfasis en la lucha contra la violencia de género, la protección de la infancia y la RRD
LOCALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN:	Kafr ad Dik, Bruqin, Salfit, Cisjordania, Palestina
SUBVENCIÓN OTORGADA:	300.000,00 €
COSTE TOTAL:	391.098,02 €
FECHA DE INICIO:	19/05/2019
FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN:	18/06/2021
PERIODO A EVALUAR:	19/05/2019-18/06/2021

Objetivos, resultados e indicadores esperados

OG: Contribuir a la protección de los derechos y la dignidad de la población palestina bajo ocupación conforme al DIH y el DIDH, con especial énfasis en la lucha contra la violencia de género, la protección de la infancia y el RRD
OE: Prevenir y mitigar el impacto de riesgos humanitarios y las crisis asociadas con violaciones de DIH/DIDH sobre los derechos y la dignidad de 9.450 personas (4.653 mujeres/niñas, 4.797 hombres/niños), Zona C, Salfit, Cisjordania, Palestina.
<p>I1.OE Reforzada la resiliencia de 200 familias vulnerables (484 mujeres/niñas, 516 hombres/niños) frente a amenazas a sus medios de vida, dignidad y derechos de propiedad, y los impactos humanitarios de las mismas, Zona C, Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18</p> <p>I2.OE Mejorado el acceso al agua para consumo humano y la salubridad de las tierras, aguas subterráneas y aire de 6.551 habitantes (3.174 mujeres y niñas, 3.377 hombres y niños), Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18</p> <p>I3.OE Potenciada la capacidad de respuesta de 9.450 personas (4.653 mujeres/niñas, 4.797 hombres/niños) vulnerables a violaciones de DIH/DIDH para reivindicar sus derechos ante violaciones y desastres, Zona C, Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18.</p> <p>I4.OE Fomentada la protección de los derechos de 2.487 niñas y 2.563 niños vulnerables a violaciones de DIH/DIDH conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño, Zona C, Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18</p> <p>I5.OE Impulsada la protección de los derechos de 2.167 mujeres, y 2.235 hombres vulnerables ante distintos tipos de violencia en función del género, Zona C, Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18.</p> <p>I6.OE Impulsado el proceso de transformación de políticas y prácticas por parte de los titulares de obligaciones que permiten continuadas violaciones de DIH/DIDH contra la población palestina bajo ocupación, mes 18.</p>
R1: Restablecidas y potenciadas las capacidades productivas de 200 hogares vulnerables (1.000 personas: 484 mujeres y niñas, 516 hombres y niños) cuyos medios de vida están amenazados, Zona C, Kafr ad Dik y Bruqin, Salfit, mes 18
<p>I1.R1 Creado un mecanismo de rendición de cuentas para presentación de reclamaciones por parte de la población destinataria de las actividades relacionadas con los medios de vida, de acuerdo con la Norma Esencial Humanitaria nº 5, Kafr ad Dik y Bruqin, mes 2</p> <p>I2.R1 Recuperados los medios de vida de 33 familias (80 mujeres/niñas, 85 hombres/niños) que dependen de tierras agrícolas vulnerables a la confiscación en Zona C, Bruqin, mes 18</p>



- I3.R1 Mejorado el acceso a tierras agrícolas en Zona C de 150 familias agricultoras (750 personas: 363 mujeres y niñas, 387 hombres y niños), Kafr ad Dik, mes 18
- I4.R1 Protegido el cultivo de 17 familias agricultoras (85 personas: 41 mujeres y niñas, 44 hombres y niños) sobre 5 HA de tierras agrícolas en Zona C, de amenazas humanas y/o naturales, Kafr ad Dik, mes 18
- I5.R1 Generados 16.313 euros de ingresos para aproximadamente 58 familias vulnerables (140 mujeres y niñas, 150 hombres y niños) en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en el acceso a trabajo por dinero, Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18
- I6.R1 Facilitado el acceso de 75 mujeres agricultoras a las tierras agrícolas de las que dependen sus medios de vida en Zona C, en condiciones de seguridad, Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18
- I7.R1 15 mujeres y 15 hombres tienen igualdad de acceso a formación sobre mejores técnicas agrícolas, la agricultura ecológica, la gestión de los recursos hídricos y las prácticas eficaces de riego, Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18

R2: Reducidas la falta de acceso al agua, la contaminación de las tierras y los acuíferos entorno a las comunidades de Kafr ad Dik y Bruqin y su incidencia sobre la salud de sus 6.551 habitantes (3.174 mujeres y niñas, 3.377 hombres y niños), mes 18

- I1.R2 Mejorada la protección de la salud de las 50 familias (117 mujeres y niñas, 123 hombres y niños) que viven en torno a los torrentes de aguas residuales de Kafr ad Dik y Bruqin provenientes de asentamientos de colonos, mes 18
- I2.R2 Mitigado el riesgo de contaminación de los medios de vida agropecuarios de 210 familias (493 mujeres y niñas, 515 hombres y niños) con tierras agrícolas y/o ganado entorno a los torrentes de aguas residuales de Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18
- I3.R2 Disminuidas las amenazas de polución de los recursos hídricos subterráneos que alimentan pozos y manantiales de la poblaciones de Bruqin y Kafr ad Dik, mes 18
- I4.R2 Resueltas las preocupaciones de 75 mujeres por la insalubridad en el entorno del hogar en las cercanías de los torrentes de aguas residuales en Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18
- I5.R2 Mejorado el acceso al agua para consumo humano de la población de 5.543 personas de Kafr ad Dik (2.685 mujeres y niñas, 2.858 hombres y niños) con el aumento de la capacidad de almacenamiento y suministro hídrico, mes 18
- I6.R2 Reducidos los riesgos para la salud de 59 niñas y 60 niños que habitan en las inmediaciones de los torrentes de aguas residuales en Kafr ad Dik y Bruqin por contaminación y recurrentes cortes en el suministro de agua; mes 18
- I7.R2 Generados 4.180 euros de ingresos para aproximadamente 6 familias vulnerables (15 mujeres y niñas, 15 hombres y niños) mediante oportunidades de trabajo por dinero, Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18

R3: Mejorado el posicionamiento de 50 personas (25 mujeres, 25 hombres) para hacer frente a riesgos que afectan al cumplimiento de los derechos de 9.450 personas vulnerables a violaciones de DIH/DIDH y desastres, Kafr ad Dik y Bruqin, Salfit, mes 18

- I1.R3 Elaborados de forma participativa e igualitaria Planes de Protección y RRD comunitarios por los Comités de Protección Comunitaria (CPC), y diseminados los mismos en Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18
- I2.R3 Creado un Comité de Protección Comunitario (CPC) en Bruqin e impulsado el CPC ya existente en Kafr ad Dik, para la Reducción del Riesgo de Desastres naturales y humanos, y para monitorear, documentar y reportar sobre violaciones de DIH/DIDH, mes 18
- I3.R3 Fomentada la participación de mujeres en los CPC de Kafr ad Dik y Bruqin, y la inclusión en su labor en la consecución de objetivos de género basados en el análisis de los diferentes riesgos y capacidad de respuesta de mujeres y hombres, mes 18
- I4.R3 Capacitados 25 mujeres y 25 hombres integrantes de los CPC en Kafr ad Dik y Bruqin en un extenso programa de formación diseñado para fomentar la resiliencia, el empoderamiento y la movilización de la comunidad ante violaciones de DIH/DIDH, mes 18
- I5.R3 Integrado un componente específico sobre los derechos de las personas con diversidad funcional y/o con otras vulnerabilidades especiales en la formación de las 50 personas integrantes de los CPC en Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18.



16.R3 Impulsado el reconocimiento entre la población de los CPCs de Kafr ad Dik y Bruqin como organizaciones de la sociedad civil en la prevención y respuesta ante desastres y violaciones, y fortalecidas sus enlaces con otros CPCs, mes 18

17.R3 Identificados y abordados riesgos que suponen una amenaza para la seguridad y el bienestar de 9.450 personas (4.653 mujeres y niñas, 4.797 hombres y niños), y para la protección medioambiental en Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18

18.R3 Diseñado un sistema para informar sobre los incidentes de violaciones de DIH/DIDH que se producen en Kafr ad Dik y Bruqin por el que el 80% de los incidentes documentados por los CPC son denunciados y/o remitidos a terceros para apoyo adicional, mes 18

19.R3 Fomentada la implicación de instituciones y voluntariado andaluces en el desarrollo de los Comités de Protección Comunitaria en Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18.

R4: Fomentada la protección de 2.487 niñas y 2.563 niños ante violaciones sistemáticas de sus derechos, Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18

11.R4 Capacitados 50 integrantes (25 mujeres, 25 hombres) de los CPC de Kafr ad Dik y Bruqin sobre la Convención sobre los Derechos del Niño, y principales instrumentos del Derecho Internacional y sistemas nacionales de protección de la infancia, mes 18

12.R4 Integrados los mecanismos internacionales y nacionales de protección infantil en el trabajo de identificación, monitoreo y denuncia desarrollado por los 50 miembros (25 mujeres, 25 hombres) de los CPC de Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18

13.R4 Apoyados 30 alumnas y 30 alumnos que presenten síntomas de angustia psicosocial, mediante 40 sesiones de terapia de grupo aplicando el enfoque de Terapia Cognitivo-Conductual, en 4 colegios públicos en Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18.

14.R4 Asistido el profesorado (20 mujeres, 20 hombres) de 4 colegios públicos en Kafr ad Dik y Bruqin en el desarrollo de sus conocimientos y habilidades en el trato con alumnos/as que presenten síntomas de estrés psicosocial, mes 18.

15.R4 Apoyados 29 madres y 31 padres en el desarrollo de sus conocimientos y habilidades en el trato con menores que presenten síntomas de angustia psicosocial a raíz de rupturas en el Ambiente Protector, en 4 colegios públicos en Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18

R5: Fomentada la protección de 4.402 adultos, con especial énfasis sobre 2.167 mujeres, ante violaciones sistemáticas de sus derechos, Kafr ad Dik y Bruqin, Salfit, mes 18

11.R5 Capacitados los 50 integrantes (25 mujeres, 25 hombres) de los CPC de Kafr ad Dik y Bruqin sobre CEDAW, y la violencia sexual y de género, mes 18

12.R5 Integrados los mecanismos de protección de los derechos de la mujer y de lucha contra la violencia sexual y de género en el trabajo de identificación y respuesta de los 50 miembros (25 mujeres, 25 hombres) de los CPC de Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18

13.R5 Apoyadas 40 mujeres y 20 hombres supervivientes de violencia de género y/u otros traumas mediante servicios de apoyo psicosocial, en función de sus diferentes vulnerabilidades y necesidades basadas en el género, en Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18

14.R5 40 mujeres supervivientes de violencia de género y/u otros traumas apoyadas con terapias grupales muestran mejores capacidades para afrontar el estrés psicosocial, Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18

15.R5 20 hombres ex detenidos por las fuerzas militares y/o con otros traumas apoyados con terapias grupales muestran mejores capacidades para afrontar el trauma relacionada con su experiencia en prisión, Kafr ad Dik y Bruqin, mes 18

R6: 103.000 titulares de responsabilidades son conscientes de los factores estructurales que provocan violaciones de DIH/DIDH en la Zona C para su posterior influencia en los titulares de obligaciones y en las políticas y prácticas que lo permiten, mes 18

11.R6 Estudios basados en cartografía e imágenes aéreas realizados por Peace Now permiten el monitoreo de la expansión de asentamientos y puestos de avanzada israelíes en Cisjordania, con un enfoque específico sobre la región de Salfit, mes 18

12.R6	103.000 personas, principalmente adultos jóvenes israelíes, cuentan con mayor conocimiento sobre los asentamientos y los puestos de avanzada israelíes como causa estructural de violaciones de los derechos de la población palestina en Zona C, mes 18
13.R6	Facilitado el acceso de la justicia a 5-10 víctimas palestinas de violaciones del DIH/DIH dentro del sistema legal israelí, mes 18.
14.R6	Registrada información actualizada sobre violaciones de DIH/DIDH cometidas contra la población palestina por civiles/militares israelíes en Cisjordania, mes 18

Actividades

A1.R1:	Creación de un mecanismo de rendición de cuentas para la presentación de reclamaciones por parte de la población destinataria, en Kafr ad Dik y Bruqin, mes 2
A2.R1:	Rehabilitación y plantación de 10 HA de tierras agrícolas de propiedad privada palestina, sin cultivar y en riesgo de confiscación, en Bruqin, meses 4-9
A3.R1:	Apertura y rehabilitación de 5 KM de caminos agrícolas, incluido el suministro de alcantarillas subterráneas en los canales de aguas residuales, en Kafr ad Dik, meses 4-14
A4.R1:	Montaje de un vallado protector en 5 HA de propiedad privada palestina en riesgo de confiscación y bajo amenazas humanas y/o naturales en Kafr ad Dik, meses 10-14
A5.R1:	Creación de oportunidades de trabajo por dinero en el sector agrícola, en Kafr ad Dik y Bruqin, meses 4-14
A6.R1:	Realización de formaciones en mejores técnicas agrícolas y agricultura ecológica, y la gestión de recursos hídricos y prácticas de riego eficientes, en Kafr ad Dik y Bruqin, meses 10-11
A1.R2:	Encauzamiento y cubrición de 200 metros lineales de torrente de aguas residuales en Kafr ad Dik (200m), meses 3-8
A2.R2:	Preparación, limpieza y excavación 1200 metros lineales de terreno en viales públicos para la instalación de tubería de suministro de agua en Kafr ad Dik, meses 3-8
A3.R2:	Instalación de 1200 metros lineales de una tubería de suministro de agua en Kafr ad Dik, meses 3-8
A4.R2:	Creación de oportunidades de trabajo por dinero en el sector de agua y saneamiento, en Kafr ad Dik y Bruqin, meses 3-8.
A1.R3:	Realización de talleres participativos para la incorporación de un enfoque de RRD, género, discapacidad y protección de la infancia, en el Plan de Protección y RRD comunitario a elaborar en Bruqin y en el existente en Kafr ad Dik, meses 3-5
A2.R3:	Celebración de dos talleres centrales en Kafr ad Dik (1) y Bruqin (1) para identificar colectivamente los riesgos y prioridades que deben incluirse en los Planes de Protección y RRD comunitarios, e identificación de los integrantes de los CPC, mes 6-7 Holding of two central workshops in Kafr ad Dik (1) and Bruqin (1) to collectively identify risks and priorities to be included in the Community Protection and DRR Plans, and identification of the members of the CPC, month 6-7
A3.R3:	Elaboración, impresión y distribución de los Planes de Protección y RRD comunitarios en Kafr ad Dik y Bruqin, mes 8-9



A4.R3:	Creación/ampliación de 2 Comités de Protección Comunitario (CPC), en Bruqin y Kafr ad Dik respectivamente, mes 7-8
A5.R3:	Realización de 3 formaciones para el nuevo CPC en Bruqin sobre: Protección, el papel del defensor de DDHH y la aplicación del DIH y DIDH; Habilidades para documentar y reportar violaciones de DIH y DIDH; Lobbying, incidencia y comunicación, meses 10-15
A6.R3:	Realización de formaciones para los CPC en Kafr ad Dik y Bruqin sobre los derechos de las personas con diversidad funcional y/o otras vulnerabilidades especiales, y el soporte vital básico, meses 10-15
A7.R3:	Realización de formaciones para los CPC sobre la Reducción de Riesgos ante Desastres, y la extinción de incendios y seguridad, en Kafr ad Dik y Bruqin, meses 10-15
A8.R3:	Distribución de los kits de soporte vital básico y protección a los CPC, en Kfar ad Dik y Bruqin, mes 14
A9.R3:	Realización de 4 visitas de intercambio con otros CPC en localidades del entorno, en Kafr ad Dik y Bruqin, meses 15-18
A10.R3:	Implementación de 2 iniciativas de protección y RRD comunitaria identificados vía los Planes de Protección y Respuesta Comunitaria, en Kafr ad Dik y Bruqin, meses 15-18
A11.R3:	Documentación y difusión por los CPC de los casos de violaciones de DIH/DIDH producidos en Kafr ad Dik y Bruqin sobre la base de un diseño/actualización de formato de informe, meses 15-18
A12.R3:	Implicación de un/a voluntario/a andaluz/a en el trabajo de los CPC, meses 16-18
A1.R4:	Realización de formaciones para los CPC sobre la protección infantil y los derechos de los niños y niñas, en Kafr ad Dik and Bruqin, meses 10-15
A2.R4:	Realización de 2 talleres participativos para la incorporación de un enfoque de protección de la infancia, y que incluya actividades relacionadas, en los Planes de Protección y RRD comunitarios en Kafr ad Dik y Bruqin, meses 3-5
A3.R4:	Celebración de 2 talleres centrales en Kafr ad Dik (1) y Bruqin (1) para identificar colectivamente los riesgos y prioridades que deben incluirse en los Planes de Protección y RRD comunitarios, con enfoque de protección de la infancia, mes 6-7
A4.R4:	Documentación y difusión por los CPC de los casos de violaciones de DIH/DIDH contra menores producidos en Kafr ad Dik y Bruqin, sobre la base de un diseño/actualización de formato de informe con enfoque de protección de infancia, meses 15-18
A5.R4:	Realización de sesiones de terapia en grupo para alumnos/as que presenten síntomas de estrés psicosocial, en Kafr ad Dik y Bruqin, meses 3-18
A6.R4:	Realización de sesiones con el profesorado para desarrollar sus conocimientos y habilidades en el trato con alumnos/as que presenten síntomas de estrés psicosocial, en Kafr ad Dik y Bruqin, meses 3-18
A7.R4:	Realización de reuniones con madres y padres de niños/s que presenten síntomas estrés psicosocial, en Kafr ad Dik y Bruqin, meses 3-18



A1.R5:	Realización de formaciones para los CPC sobre el papel de la mujer en la resolución de conflictos y la construcción de la paz según la Resolución 1325 de la ONU, CEDAW, y la violencia sexual y de género en Kafr ad Dik y Bruqin, meses 10-15
A2.R5:	Realización de 2 talleres participativos para la incorporación de la perspectiva de mujeres, y que incluya actividades relacionadas, en los Planes de Protección y RRD comunitarios en Kafr ad Dik y Bruqin, meses 3-5
A3.R5:	Celebración de dos talleres centrales en Kafr ad Dik (1) y Bruqin (1) para identificar colectivamente los riesgos y prioridades que deben incluirse en los Planes de Protección y RRD comunitarios, desde la perspectiva de mujeres, mes 6-7
A4.R5:	Documentación y difusión por los CPC de los casos de violaciones de DIH/DIDH contra mujeres producidos en Kafr ad Dik y Bruqin, sobre la base de un diseño/actualización de formato de informe con enfoque de género; meses 15-18
A5.R5:	Realización de sesiones de terapia en grupo para mujeres víctimas de violencia de género y/o que presentan síntomas estrés psicosocial, en Kafr ad Dik y Bruqin, meses 3-12
A6.R5:	Realización de sesiones de terapia en grupo para hombres ex detenidos por las fuerzas militares y/o que presentan síntomas de estrés psicosocial, en Kafr ad Dik y Bruqin, meses 3-12
A1.R6:	Monitoreo y actualización por Peace Now de datos sobre los asentamientos y puestos de avanzada israelíes como violación del DIH/DIDH, meses 1-18
A2.R6:	Realización de una campaña de incidencia social por Peace Now dirigido a titulares de responsabilidades, meses 2-18
A3.R6:	Registro de testimonios de víctimas afectadas por delitos contra la propiedad, delitos violentos, confiscación de tierras o daños ambientales cometidos por colonos/militares israelíes, meses 2-18
A4.R6:	Registro de los casos por tipo de incidente y ubicación geográfica, y con datos desglosados por género, meses 2-18
A5.R6:	Uso de datos de los casos registrados para informar a las actividades de incidencia de Yesh Din, meses 2-18

Annex 2g: GVA 2019 project sheet

INSTITUCIÓN Y AÑO DE CONVOCATORIA:	Generalitat Valenciana (GVA) 2019
ENTIDAD BENEFICIARIA:	Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP)
ENTIDAD LOCAL SOCIA:	Agricultural Development Association (PARC) Palestinian Hydrology Group (PHG) Psycho-Social Counseling Center for Women (PSCCW)
TÍTULO DE LA INTERVENCIÓN:	PROTECCIÓN INTEGRADA DE LOS DERECHOS Y LA DIGNIDAD DE LA POBLACIÓN PALESTINA BAJO OCUPACIÓN CONFORME AL DIH Y EL DIDH, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LA EQUIDAD DE GÉNERO, LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y EL RRD.
LOCALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN:	Bruqin y Rafat, Zona C, Salfit, Cisjordania, Palestina.
SUBVENCIÓN OTORGADA:	300.000,00 €
COSTE TOTAL:	375.007,92 €
FECHA DE INICIO:	16/09/2020
FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN:	16/09/2021
PERIODO A EVALUAR:	16/09/2020-16/09/2021

Objetivos, resultados e indicadores esperados

OG: Contribuir a la protección integrada de los derechos y la dignidad de la población palestina bajo ocupación conforme al DIH y el DIDH, con especial énfasis en la equidad de género, la protección de la infancia y el RRD
OE: Prevenir y mitigar el impacto de riesgos humanitarios y las crisis asociadas con violaciones de DIH/DIDH sobre los derechos y la dignidad de 6.184 personas (2.981 mujeres/niñas, 3.203 hombres/niños), Zona C, Salfit, Cisjordania, Palestina
OE1.IOV1: Mejorado el acceso al agua para consumo humano y la salubridad de las tierras, aguas subterráneas y aire de 6.184 habitantes (2.981 mujeres y niñas, 3.203 hombres y niños), Bruqin y Rafat, mes 12
OE1.IOV2: Reforzada la resiliencia de 75 familias vulnerables (375 personas: 182 mujeres y niñas, 193 hombres y niños) frente a amenazas a sus medios de vida, dignidad y derechos de propiedad, y los impactos humanitarios de las mismas, Zona C, Bruqin y Rafat, mes 12
OE1.IOV3: Potenciada la capacidad de respuesta de 6.184 personas (2.981 mujeres/niñas, 3.203 hombres/niños) vulnerables a violaciones de DIH/DIDH ante violaciones y desastres, Zona C, Bruqin y Rafat, mes 12
OE1.IOV4: Fomentada la protección de los derechos de 1.594 niñas y 1.711 niños vulnerables a violaciones de DIH/DIDH conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño, Zona C, Bruqin y Rafat, mes 12
OE1.IOV5: Impulsada la protección de los derechos de 1.388 mujeres, y 1.492 hombres vulnerables ante distintos tipos de violencia en función del género, Zona C, Bruqin y Rafat, mes 12
OE1.IOV6: Impulsado el proceso de transformación de políticas y prácticas por parte de los titulares de obligaciones que permiten continuadas violaciones de DIH/DIDH contra la población palestina bajo ocupación, mes 12
R1: Reducidas la falta de acceso al agua, la contaminación de las tierras y los acuíferos entorno a las comunidades de Bruqin y Rafat, y su incidencia sobre la salubridad de sus 6.184 habitantes (2.981 mujeres/niñas, 3.203 hombres/niños), mes 12
R1.IOV1: Reforzada la resiliencia de 6.184 personas (2.981 mujeres/niñas, 3.203 hombres/niños) ante la escasez repetida de agua, y el impacto humanitario de la misma, en Bruqin y Rafat, mes 12



<p>R1.IOV2: Aumentado, en un promedio de 25%, el consumo de agua de calidad de 150 personas (73 mujeres y niñas, 77 hombres y niños) (de un promedio de 52,5 LCD a un promedio de 65 LCD), en Bruqin y Rafat, mes 12</p> <p>R1.IOV3: Fomentada la protección medioambiental y el uso eficaz de los recursos hídricos de los que depende el suministro de agua, en Bruqin y Rafat, mes 12</p> <p>R1.IOV4: Reducido el tiempo semanal invertido por 73 mujeres y niñas en la compra de agua de camiones durante periodos de escasez, de 90 a 30 minutos, en Bruqin y Rafat, mes 12</p> <p>R1.IOV5: 10 mujeres y 10 hombres tienen igualdad de acceso a formación sobre la gestión de los recursos hídricos, Bruqin y Rafat, mes 12</p> <p>R1.IOV6: Mejorada la protección de la salubridad de las 50 familias (121 mujeres y niñas, 129 hombres y niños) que viven en torno a los torrentes de aguas residuales de Bruqin provenientes de asentamientos de colonos, mes 12</p> <p>R1.IOV7: Mitigado el riesgo de contaminación de los medios de vida agropecuarios de 140 familias (700 personas: 339 mujeres y niñas, 361 hombres y niños) con tierras agrícolas y/o ganado entorno a los torrentes de aguas residuales de Bruqin, mes 12</p> <p>R1.IOV8: Disminuidas las amenazas de polución de los recursos hídricos subterráneos que alimentan pozos y manantiales de la población de Bruqin, mes 12</p>
<p>R2: Potenciadas las capacidades productivas de 75 familias en situación de vulnerabilidad (375 personas: 182 mujeres y niñas, 193 hombres y niños) cuyos medios de vida están amenazados, Zona C, Bruqin y Rafat, Salfit, mes 12</p>
<p>R2.IOV1: Creado un mecanismo de rendición de cuentas para presentación de reclamaciones por parte de la población destinataria de las actividades relacionadas con los medios de vida, de acuerdo con la Norma Esencial Humanitaria nº 5, Bruqin y Rafat, mes 2</p> <p>R2.IOV2: Mejorado el acceso a 400 dunums/40 HA de tierras agrícolas en Zona C de 75 familias agricultoras (375 personas: 182 mujeres y niñas, 193 hombres y niños), Bruqin y Rafat, mes 12</p> <p>R2.IOV3: Reducido en un promedio de 30 minutos el tiempo necesario por parte de 75 mujeres agricultoras en acceder a sus tierras agrícolas en Zona C, Bruqin y Rafat, mes 12</p> <p>R2.IOV4: Protegidas 1000m2 de tierras agrícolas en Zona C de amenazas humanas y/o naturales, Bruqin y Rafat, mes 12</p> <p>R2.IOV5: Optimizadas las condiciones medioambientales (estructura del suelo y retención de agua) de 1000m2 de tierras agrícolas, Zona C, Bruqin y Rafat, mes 12</p> <p>R2.IOV6: Generados 6.000 euros de ingresos para aproximadamente 13 familias en situación de vulnerabilidad (31 mujeres y niñas, 34 hombres y niños) en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en el acceso a dinero por trabajo, Bruqin y Rafat, mes 12</p> <p>R2.IOV7: Aumentado la capacidad de almacenamiento para agua de lluvia en 450m3, para el riego de tierras agrícolas en riesgo de confiscación en Zona C, Bruqin y Rafat, mes 12</p> <p>R2.IOV8: Mejorado el acceso al agua para uso agrícola en Zona C de 10 familias (24 mujeres y niñas, 26 hombres y niños) en Bruqin y Rafat, mes 12</p>
<p>R3: Apoyada la capacidad de los Comités de Protección Comunitaria (26 mujeres, 24 hombres) de Bruqin y Rafat para hacer frente a riesgos que afectan al cumplimiento de los derechos de 6.184 personas (2.981 mujeres/niñas, 3.203 hombres/niños) vulnerables a violaciones de DIH/DIDH y desastres, mes 12</p>
<p>R3.IOV1: Identificados de manera participativa riesgos que suponen una amenaza para la seguridad y el bienestar de 6.184 personas (2.981 mujeres/niñas, 3.203 hombres/niños), y para la protección medioambiental en Bruqin y Rafat, mes 12</p> <p>R3.IOV2: Implementadas dos iniciativas comunitarias de RRD y protección en Bruqin y Rafat para el beneficio colectivo de sus 6.184 habitantes (2.981 mujeres/niñas, 3.203 hombres/niños), mes 12</p>
<p>R4: Fomentada la protección de 1.594 niñas y 1.711 niños ante violaciones sistemáticas de sus derechos, en Bruqin y Rafat, mes 12</p>
<p>R4.IOV1: Apoyados 30 alumnas y 30 alumnos que presenten síntomas de angustia psicosocial, mediante 40 sesiones de terapia de grupo aplicando el enfoque de Terapia Cognitivo-Conductual, en 4 colegios públicos en Bruqin y Rafat, mes 12</p>

R4.IOV2: Asistido el profesorado (20 mujeres, 20 hombres) de 4 colegios públicos en Bruqin y Rafat en el desarrollo de sus conocimientos y habilidades en el trato con alumnos/as que presenten síntomas de estrés psicosocial, mes 12

R4.IOV3: Formados 40 profesores/as (20 mujeres, 20 hombres) de 4 colegios públicos en Bruqin y Rafat sobre el impartido de clases de refuerzo pedagógico para alumnos/as que presenten síntomas de estrés psicosocial, mes 12

R4.IOV4: Apoyados 29 madres y 31 padres en el desarrollo de sus conocimientos y habilidades en el trato con menores que presenten síntomas de angustia psicosocial a raíz d rupturas en el Ambiente Protector, en 4 colegios públicos en Bruqin y Rafat, mes 12

R5: Fomentada la protección de 2.880 adultos, con especial énfasis sobre 1.388 mujeres, ante violaciones sistemáticas de sus derechos, Bruqin y Rafat, Salfit, mes 12

R5.IOV1: Apoyadas 40 mujeres y 20 hombres supervivientes de violencia de género y/u otros traumas mediante servicios de apoyo psicosocial, en función de sus diferentes vulnerabilidades y necesidades basadas en el género, en Bruqin y Rafat, mes 12

R5.IOV2: 40 mujeres supervivientes de violencia de género y/u otros traumas apoyadas con terapias grupales muestran mejores capacidades para afrontar el estrés psicosocial, Bruqin y Rafat, mes 12

R5.IOV3: 20 hombres ex detenidos por las fuerzas militares y/o con otros traumas apoyados con terapias grupales muestran mejores capacidades para afrontar el trauma relacionada con su experiencia en prisión, Bruqin y Rafat, mes 12

R5.IOV4: Sensibilizados 20 mujeres lideresas religiosas, y 20 hombres líderes religiosos comunitarios para integrar la cuestión de la violencia de género en su labor, Bruqin y Rafat, mes 12

R5.IOV5: 20 mujeres influencer de las comunidades de Bruqin y Rafat, amplían sus conocimientos y se sensibilizan en relación con el derecho internacional, nacional y las convenciones internacionales, mes 12

R6: 149.670 titulares de responsabilidades (aprox. 74.236 mujeres y 75.434 hombres) son conscientes de los factores estructurales que provocan violaciones de DIH/DIDH en la Zona C para su posterior influencia en 330 titulares de obligaciones (aprox. 164 mujeres y 166 hombres), y en políticas y prácticas que lo permiten, mes 12

R6.IOV1: Estudios basados en cartografía e imágenes aéreas realizados por Peace Now permiten el monitoreo de la expansión de asentamientos y puestos de avanzada israelíes en Cisjordania, con un enfoque específico sobre la región de Salfit, mes 12

R6.IOV2: 150.000 personas, principalmente adultos jóvenes israelíes, cuentan con mayor conocimiento sobre los asentamientos y los puestos de avanzada israelíes como causa estructural de violaciones de los derechos de la población palestina en Zona C, mes 12

R6.IOV3: Facilitado el acceso de la justicia a 5-10 víctimas palestinas de violaciones del DIH/DIH dentro del sistema legal israelí, mes 12

R6.IOV4: Registrada información actualizada sobre violaciones de DIH/DIDH cometidas contra la población palestina por civiles/militares israelíes en Cisjordania, mes 12

R6.IOV5: 280 titulares de obligaciones (139 mujeres y 141 hombres, tomadores/as de decisiones y diplomáticos/as extranjeros/as, reciben información actualizada y análisis sobre violaciones de DDHH cometidas contra la población palestina, mes 12

R6.IOV6: 375 titulares de responsabilidades (186 mujeres y 189 hombres), periodistas israelíes e internacionales, reciben información y análisis, comunicados de prensa, asistencia para la preparar de artículos y material audiovisual sobre violaciones de DDHH cometidas contra la población palestina, mes 12

R6.IOV7: 125.000 titulares de responsabilidades (62.000 mujeres y 63.000 hombres), miembros del publico israelí e internacional, actores educacionales, religiosos, académicos y activistas reciben el boletín digital de B'Tselem y análisis que aparecen en los medios de comunicación, y las redes sociales de B'Tselem, mes 12

R6.IOV8: 50 titulares de obligaciones israelíes e internacionales de alta perfil están expuestos a información y análisis sobre violaciones de DDHH cometidas contra la población palestina, a través de entrevistas, noticias y artículos en los medios de comunicación, e informes y comunicado de prensa de B'Tselem, mes 12

R6.IOV9: Canalizados los materiales de análisis, incidencia y sensibilización elaborados en el marco del proyecto a titulares de responsabilidades y obligaciones en Valencia, España e Europa, mes 12

Actividades

- A1.R0. Firma de planes de trabajo entre ACPP y PARC, ACPP y el PHG, y ACPP y PSCCW
 - A2.R0. Constitución del Comité de Gestión del proyecto
 - A3.R0. Revisión de los criterios de selección y diseño de herramientas de seguimiento por el Comité de Gestión
 - A4.R0. Reunión de inicio del proyecto
 - A5.R0. Proceso de selección de la población destinataria
 - A6.R0. Establecimiento de la línea de base del proyecto por el Comité de Gestión
 - A7.R0. Procedimiento de licitación para servicios, obras y suministros
 - A8.R0. Reunión de cierre del proyecto
 - A9.R0. Monitoreo, seguimiento y visibilidad
-
- A1.R1. Preparación, limpieza y excavación de 400 metros lineales y 900 metros lineales de terreno en viales públicos para la instalación de tubería de suministro de agua en Bruqin y Rafat respectivamente
 - A2.R1. Instalación de 400m y 900m metros lineales de tuberías de suministro de agua en Bruqin y Rafat respectivamente, y de las conexiones domiciliarias.
 - A3.R1. Realización de formaciones en la gestión de recursos hídricos en Bruqin y Rafat
 - A4.R1: Encauzamiento y cubrición de 200 metros lineales de torrente de aguas residuales en Bruqin
-
- A1.R2: Creación de un mecanismo de rendición de cuentas para la presentación de reclamaciones por parte de la población destinataria, en Bruqin y Rafat
 - A2.R2: Apertura y construcción de 1,5 KM y 1 KM de caminos agrícolas en Bruqin y Rafat respectivamente
 - A3.R2: Creación de oportunidades de dinero por trabajo en la erección de 400 m2 y 600 m2 de muros de contención de piedra en Bruqin y Rafat respectivamente
 - A4.R2: Rehabilitación de 5 cisternas agrícolas en Bruqin y 5 en Rafat
-
- A1.R3: Identificadas riesgos que suponen una amenaza para la seguridad y el bienestar de la población de Bruqin y Rafat, y priorizadas respuestas de protección y/o RRD a las mismas
 - A2.R3: Adquiridos los materiales y suministros necesarios para la implementación de dos iniciativas comunitarias de RRD y protección, y ejecutadas las mismas en Bruqin y Rafat
-
- A1.R4: Realización de sesiones de terapia en grupo para alumnos/as que presenten síntomas de estrés psicosocial, en Bruqin y Rafat
 - A2.R4: Realización de sesiones con el profesorado para desarrollar sus conocimientos y habilidades en el trato con alumnos/as que presenten síntomas de estrés psicosocial, en Bruqin y Rafat
 - A3.R4: Realización de capacitaciones para el profesorado de 4 colegios públicos en Bruqin y Rafat sobre el impartido de clases de refuerzo pedagógico
 - A4.R4: Realización de reuniones con madres y padres de niños/s que presenten síntomas estrés psicosocial, en Bruqin y Rafat
-
- A1.R5: Realización de sesiones de terapia en grupo para mujeres víctimas de violencia de género y/o que presentan síntomas estrés psicosocial, en Bruqin y Rafat
 - A2.R5: Realización de sesiones de terapia en grupo para hombres ex detenidos por las fuerzas militares y/o que presentan síntomas de estrés psicosocial, en Bruqin y Rafat
 - A3.R5: Realización de acciones de sensibilización dirigidas a mujeres y hombres figuras religiosas de Bruqin y Rafat, sobre la cuestión de la violencia de género
 - A4.R5: Realización de acciones de sensibilización dirigidas a mujeres influenciar en Bruqin y Rafat, sobre el derecho internacional, nacional y las convenciones internacionales



A1.R6: Asistencia técnica especializada en actividades de asentamientos israelíes en la zona de intervención del proyecto: Monitoreo y actualización por Peace Now de datos sobre los asentamientos y puestos de avanzada israelíes como violación del DIH/DIDH

A2.R6: Asistencia técnica especializada en actividades de asentamientos israelíes en la zona de intervención del proyecto: Realización de una campaña de sensibilización por Peace Now dirigido a titulares de responsabilidades

A3.R6: Servicios especializados de asistencia legal y monitoreo del acceso de la población palestina a la justicia: Registro de testimonios de víctimas afectadas por delitos contra la propiedad, delitos violentos, confiscación de tierras o daños ambientales cometidos por colonos/militares israelíes

A4.R6: Servicios especializados de asistencia legal y monitoreo del acceso de la población palestina a la justicia: Registro de los casos por tipo de incidente y ubicación geográfica, y con datos desglosados por género

A5.R6: Servicios especializados de asistencia legal y monitoreo del acceso de la población palestina a la justicia: Uso de datos de los casos registrados para informar a las actividades de sensibilización de Yesh Din

A6.R6: Prestación de servicios profesionales especializados de B'Tselem en defensa de los derechos humanos

A7.R6: Difusión de materiales de análisis, incidencia y sensibilización a titulares de responsabilidades y obligaciones en Valencia, España e Europa



Annex 3: ACPP's Code of Conduct



**M 01 CODIGO
GENERAL DE CONDI**



**M 01 CODIGO
GENERAL DE CONDI**



Annex 4: ACPP's Goods and Services Procurement Manual



**M 03 MANUAL DE
ADQUISICIÓN DE BII**



**M 03 MANUAL DE
ADQUISICIÓN DE BII**
